

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事（一部債務）（余フ）

地域の皆様におかれましては日頃より、工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

本工事は補強土壁工の仕上げ、橋台周りのブロック積み等の築造に入り順次、路床盛土工事へ移行してまいります。

工事中は皆様方にご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、一日も早い工事の完成をめざしております。

工 期 : 令和2年12月25日～令和3年12月20日


工 事 概 要 : 道路改良工事

(本線部) L=389m 盛土工V=7300m³ 地盤改良工V=1800m³

補強土壁工A=103m² 踏掛版工一式

(県道部) L=122m 排水構造物工L=238.6m

工 事 進 捗 率 : 8月末時点 50.0%

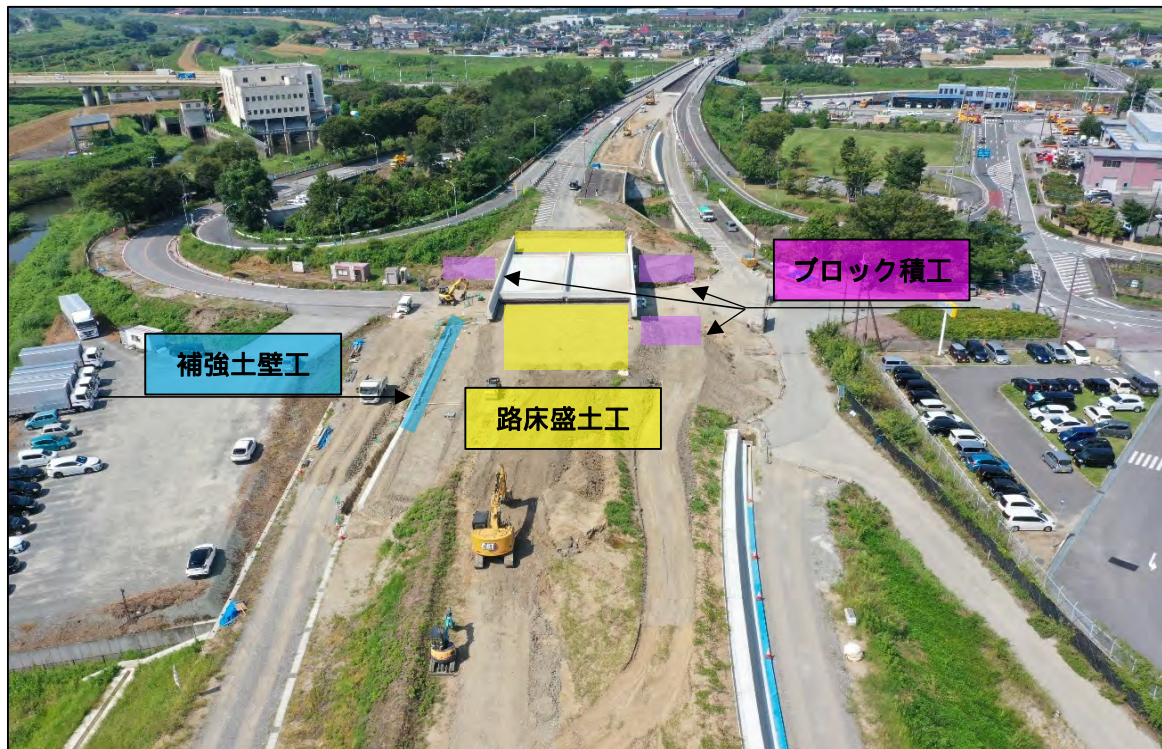

施 工 会 社 :  大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7番1号

055-233-5518

現場代理人 源川雅之



国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 橋梁工事（一部債務） （小曲町35工区）

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。
 8月末現在、A1橋台 躯体工を施工中です。本工事は特許工法の複合門型ラーメン橋を採用した工事です。工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

工 期：令和3年3月3日～令和4年1月31日

工事概要：複合門形ラーメン橋 1基
 L=17.0m W=19.14m (18.25m)
 橋台工N=1基 (H=7.4m W=20.0m)
 鋼管杭 (φ600) N=26本

道路改良工 L=130.1m
 盛土工 V=6950m³




A1橋台(施工中)

A2橋台(施工済)

構造イメージ図

H鋼桁剛結のため鉄筋ミリ単位調整

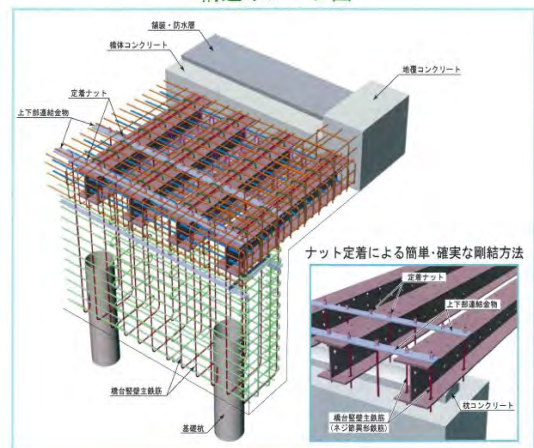

施工会社



国際建設株式会社
 安全に・より良く・より早く

山梨県甲府市塩部4丁目15番5号
 TEL：055-251-2111（代表）

FAX：055-254-7822

現場代理人 小林 新吾
 監理技術者 里吉 進志

5S+1 運動実施中



令和2年度 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(明許)(2補)

日頃より、地域住民の皆様には、工事へのご協力をいただき感謝いたします。
本工事は、ボックスカルバート1基と環状道路本線の路体盛土を施工する道路改良
工事です。

8月末時点では、地盤改良工が完了しており、現在はカルバート工の基礎工を
行っています。来月からは引き続きカルバート工と、並行して盛土工を施工して
行きます。

R3.8月末撮影

至
南
ア
ル
プ
ス
↑



↓
至
石
和

工 期 : 令和3年3月24日～令和4年2月25日
工 事 概 要 : 道路改良工事 L=141m
盛土工 V=14,100m³
カルバート工 1基 (B=7.9m×H=4.4m×W=23.8m)
工事進捗状況 : 8月末時点 41.0%



大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7-1

☎055-233-5518

現場代理人・監理技術者

清水 信



国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 気象観測装置設置工事(明許)(2補)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたりご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
気象観測装置設置工事につきましては工場での各種機器類の製作・調整を進めております。
10月からの現場着工に向け現地に現場事務所を設置いたしました。
安全第一で、環境に配慮した工事が行えるよう取り組んでまいります。工事期間中はご不便ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

工事概要：気象観測装置設置

(雨雪量計・風向風速計・通風式気温計・路面放射温度計)

工期：令和3年3月17日～令和3年12月24日

工事進捗率：35%



現場事務所



KD (株)甲斐電設

甲斐市名取684-3

現場代理人：上野 正樹

☎055-276-0682

主任技術者：内藤 満

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（明許）（2補）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠に有難う御座います。本工事は5月中旬より施工が着手致しまして、東側の本線法面の防草シートが完了し、現在は西側本線法面の法尻防草ブロックの施工が7割終了しております。地域への皆様方には何かとご不便ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事の早期完成を目指しますので、引き続きご協力宜しくお願い申し上げます。

施工範囲



法尻防草ブロック工 施工済み




法尻防草ブロック

法尻防草ブロック施工手順



施工横断図（側道）

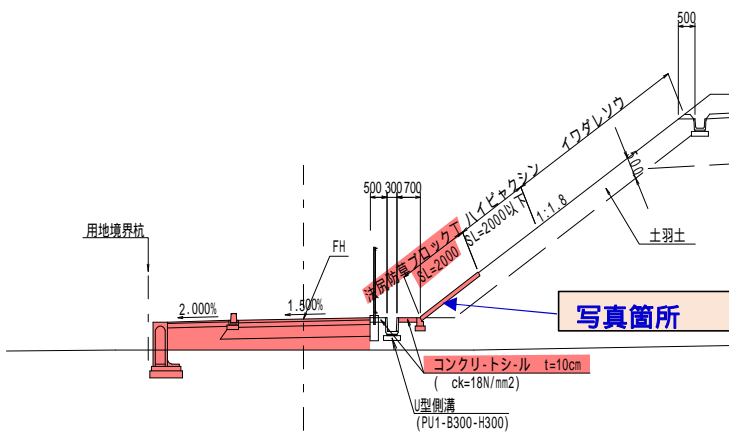

工事概要

道路改良工 L=773m
法尻防草ブロック工 A=1,569m²
排水構造物工 L=182m
舗装工（下層路盤） A=3,724m²

工期

令和3年3月24日～令和3年12月24日

工事進捗率

50.8%（8月末時点）

請負会社

中沢工業株式会社
山梨県甲府市幸町9-24
055-233-4801

現場代理人 長嶺 裕二
