

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事（一部債務）（余フ）

地域の皆様におかれましては日頃より、新環状線道路工事へのご理解とご協力を
いただきまして誠にありがとうございます。

本工事は踏掛版工の築造を中心に本線部の排水構造物を順次、行って参ります。
工事中は皆様方にご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、一日も早い工事の完成
をめざしております。

引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお祈いします。

工 期 : 令和2年12月25日～令和3年12月20日


工 事 概 要 : 道路改良工事

(本線部) L=389m 盛土工V=7300m³ 地盤改良工V=1800m³

補強土壁工A=103m² 踏掛版工一式

(県道部) L=122m 排水構造物工L=238.6m

工事進捗率 : 10月末時点 67.0%

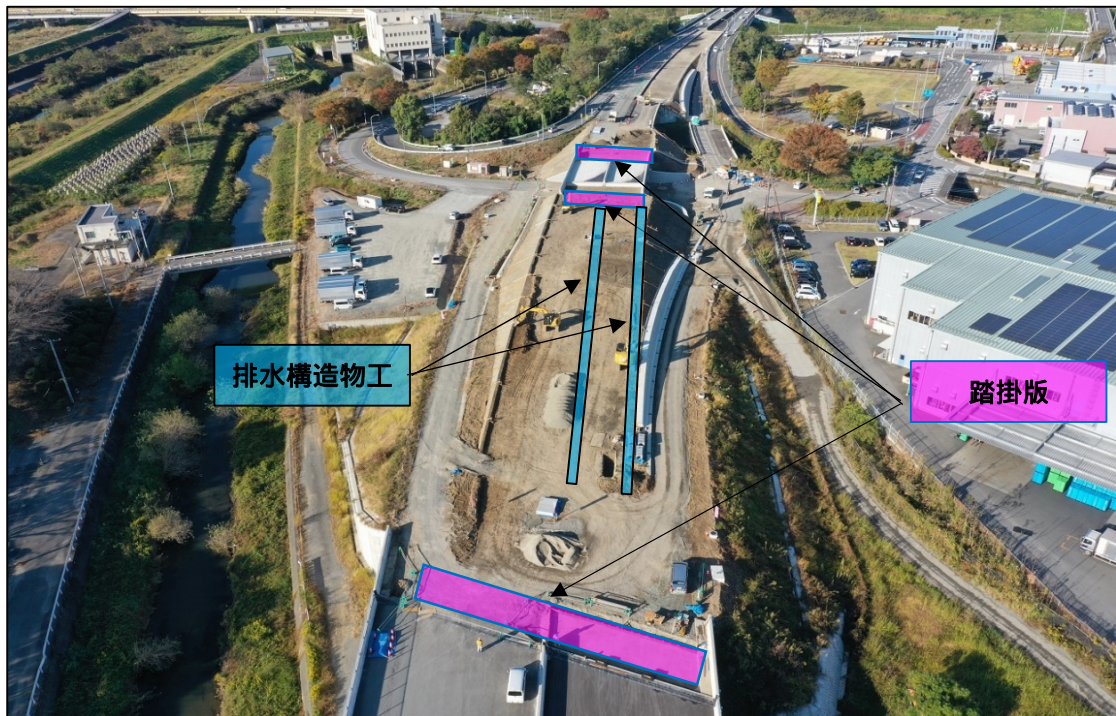

至南アルプス

至石和

施 工 会 社 :  大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7番1号

055-233-5518

現場代理人 源川雅之




国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 橋梁工事（一部債務） （小曲町35工区）

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。
ございます。

10月末現在、A1橋台 躯体工コンクリート打設完了です。引き続き 上部工H鋼桁架設工事を開始します。工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

工 期：令和3年3月3日～令和4年1月31日

工事概要：複合門形ラーメン橋 1基 道路改良工 L=130.1m
L=17.0m W=19.14m (18.25m) 盛土工 V=6950m³
橋台工N=1基 (H=7.4m W=20.0m)
鋼管杭 (φ600) N=26本

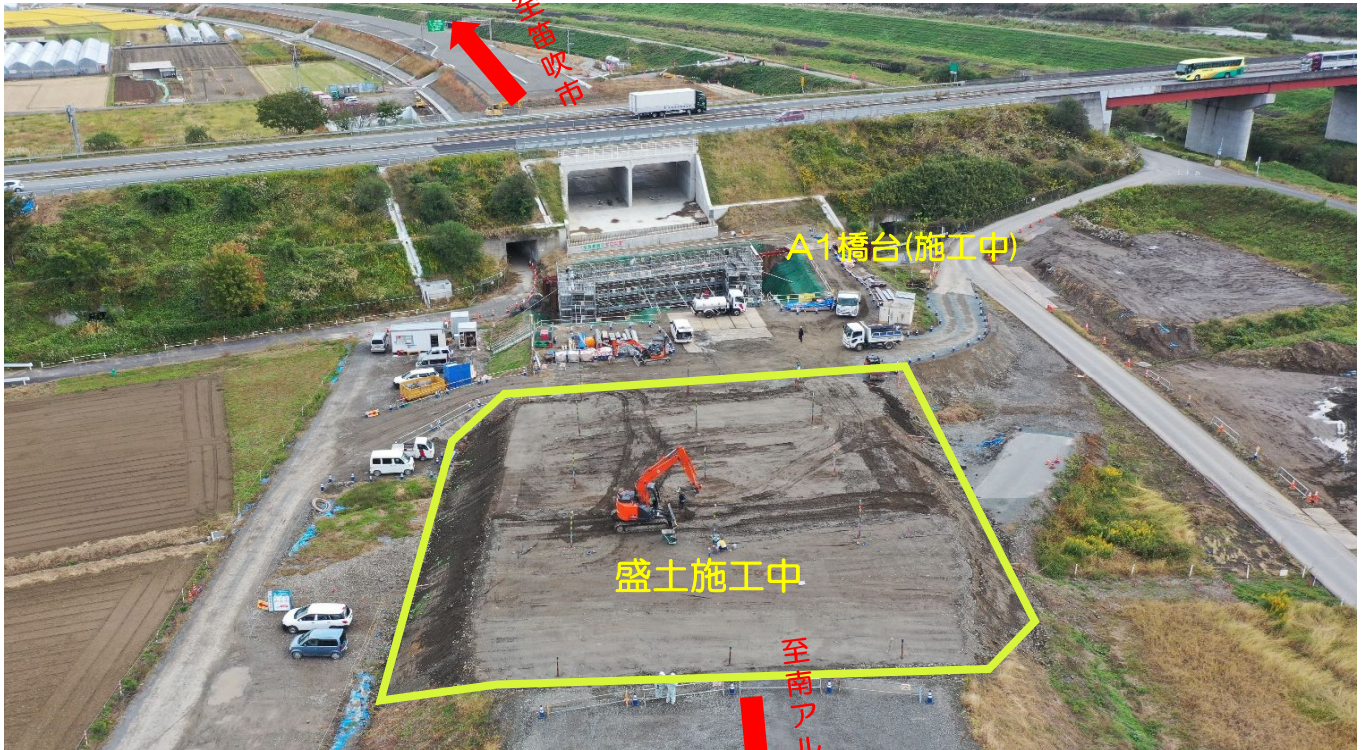

施工会社



国際建設株式会社

安全に・より良く・より早く

山梨県甲府市塩部4丁目15番5号
TEL：055-251-2111（代表）

FAX：055-254-7822

現場代理人 小林 新吾
監理技術者 里吉 進志

5S+1 運動実施中



令和2年度 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(明許)(2補)



日頃より、地域住民の皆様には、工事へのご協力をいただき感謝いたします。
本工事は、ボックスカルバート1基と環状道路本線の路体盛土を施工する道路改良
工事です。



10月末時点では、カルバート工は底版部まで完成しており、盛土工は総数量の
半分程度完了しています。来月以降も引き続きカルバート工と盛土工をメインに
施工していきます。



R3.10月末撮影



至
南
ア
ル
プ
ス



至
石
和

工 期 : 令和3年3月24日～令和4年2月25日
工 事 概 要 : 道路改良工事 L=141m
盛土工 V=14,100m³
カルバート工 1基 (B=7.9m×H=4.4m×W=23.8m)
工事進捗状況 : 10月末時点 57.0%



大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7-1
☎055-233-5518

現場代理人・監理技術者
清水 信





国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 気象観測装置設置工事(明許)(2補)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたりご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
気象観測装置設置工事につきましては基礎工事、通信線の配管工事をほぼ終わりました。
11月の中旬に装置の取付を行い12月の工事完了に向け、安全第一で、環境に配慮した工事が行えるよう取り組んでまいります。工事期間中はご不便ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。




工事概要：気象観測装置設置

(雨雪量計・風向風速計・通風式気温計・路面放射温度計)

工期：令和3年3月17日～令和3年12月24日

工事進捗率：60%



KD 株甲斐電設

甲斐市名取684-3

☎055-276-0682

現場代理人：上野 正樹

主任技術者：内藤 満

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事その1（明許）（2補）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠に有難う御座います。本工事は5月中旬より施工を着手し、現在は工事も終盤を迎えて、側道の歩道及び側溝工事を行っています。地域への皆様方には、何かとご不便ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事の早期完成を目指しますので、引き続きご協力宜しくお願い申し上げます。

施工範囲



現在進捗状況



縁石工（歩車道境界ブロック）



機械掘削状況



基礎砕石転圧状況



基礎コンクリート打設




縁石布設



縁石完了

施工横断図（側道）

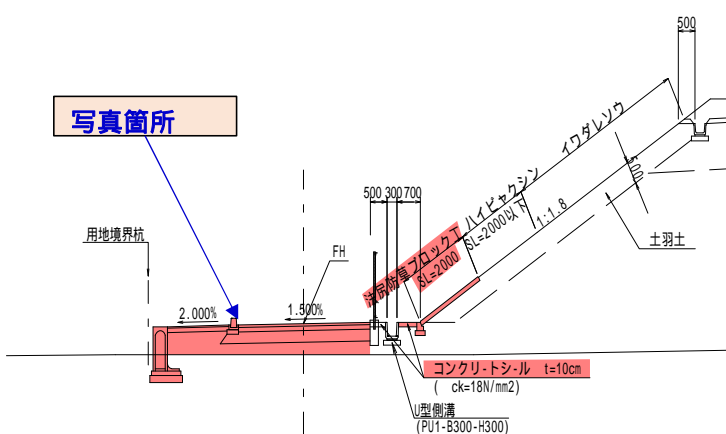

工事概要

道路改良工 L=773m
法尻防草ブロック工 A=1,569m²
排水構造物工 L=182m
舗装工（下層路盤） A=3,724m²

工期

令和3年3月24日～令和3年12月24日

工事進捗率

71.7%（10月末時点）

請負会社

中沢工業株式会社
山梨県甲府市幸町9-24
055-233-4801

現場代理人 長嶺 裕二

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

平素より皆様方には工事に御協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

本工事は、西下条ランプ部へ道路照明の設置、及び本線からランプ部への分流部に視線誘導灯を設置し、これに必要な電気配管・配線を行う工事です。

また、本線の非常駐車帯付近への非常電話機の設置や、道路状況を監視するためのカメラの設置も行います。

工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をお願い申し上げます。



工 期 令和3年8月27日～令和4年3月15日

工事概要 電気設備工事

道路照明設置 N=20基、非常用電話設置 N=4基

視線誘導灯設置 N=2基、監視カメラ設置 N=2基

工事進捗率 10月末時点 17%

施工会社



和泉電気工業株式会社

山梨県甲府市下鍛冶屋町163-5

☎055(241)5851

現場代理人 桜井 敏博
