

新山梨環状道路通信


～12月 工事・設計・ 用地測量等の進捗状況～

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条ランプ(甲府市西下条町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町広瀬)までの東部区間($L=7.1\text{km}$)の事業を進めています。

今回は、落合西IC(甲府市落合町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町広瀬)の東部区間2期($L=5.5\text{km}$)の工事進捗状況ならびに設計・用地測量等の進捗状況をお伝えいたします。

～東部区間 2 期 全体概要図～

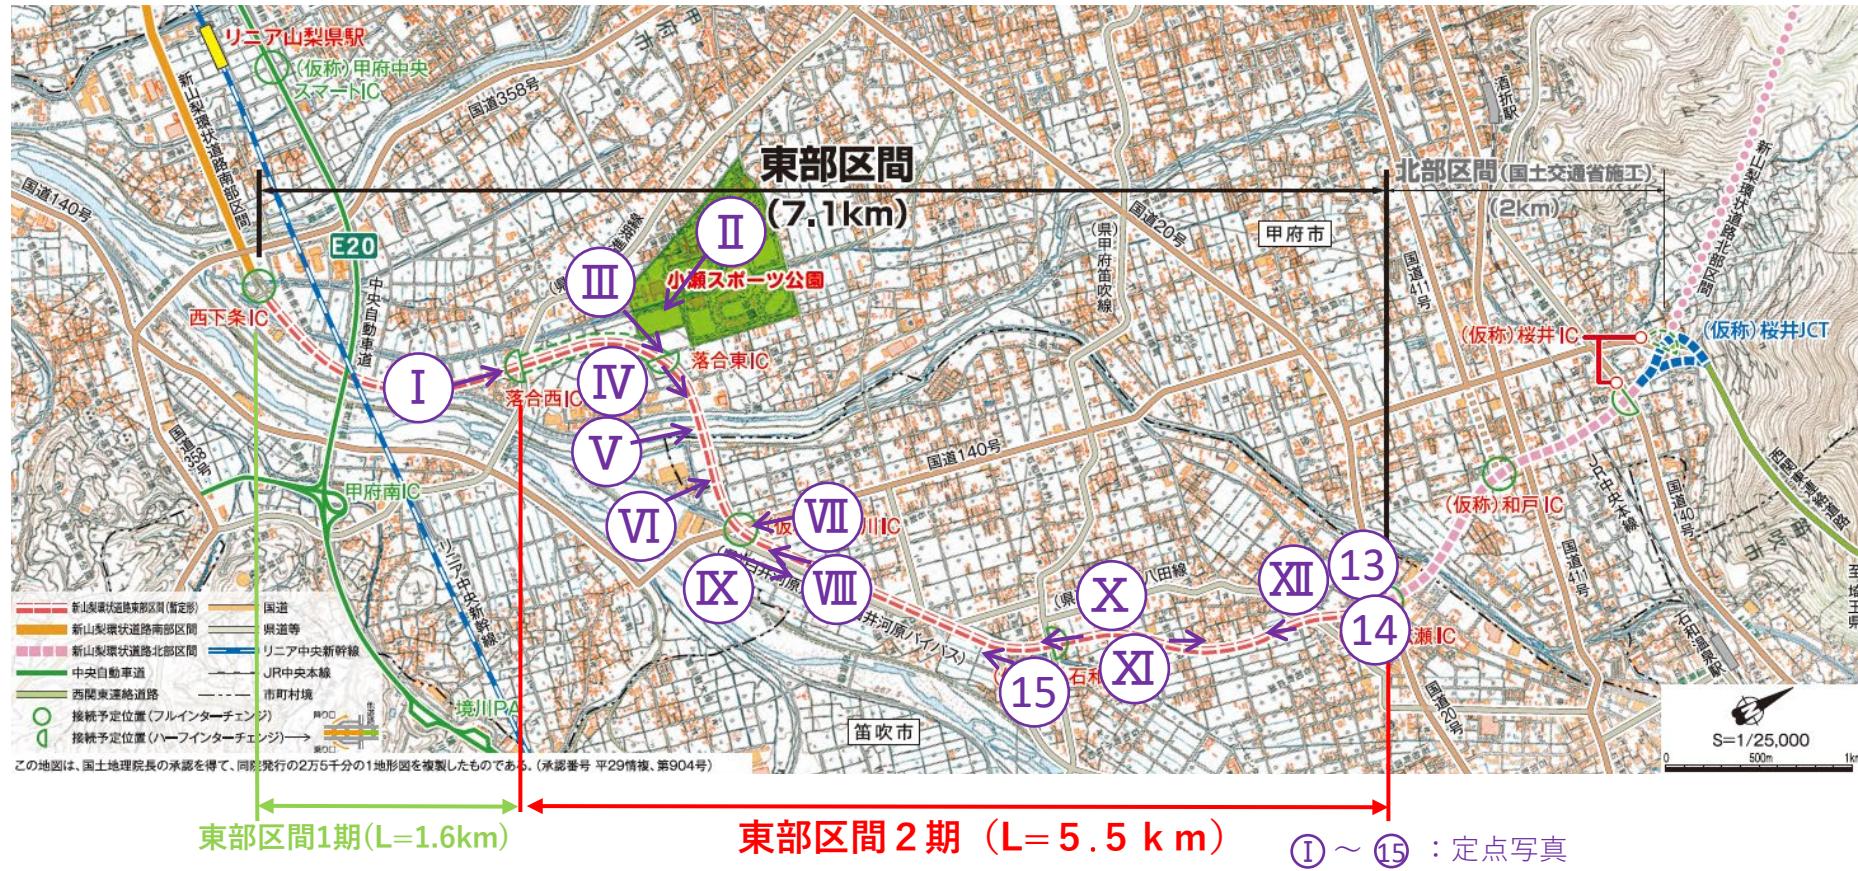

令和7年度 新山梨環状道路(東部区間2期) 工事一覧

No.	契約番号	工事名	工期	受注者	No.	契約番号	工事名	工期	受注者
①	道整23-0034	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合3号橋（仮称）上部工事（一部債務）（余7）（補特）	R6.3.27～R8.3.13	高田機工・飯田鉄工JV	⑧	道整24-0059	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）唐柏4号橋下部工事（一部債務）（余7）	R7.3.4～R8.6.29	風間興業
②	道整24-0007	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合5号橋（仮称）上部工製作・架設工事（一部債務）	R6.10.15～R8.6.26	三井住友建設鉄構エンジニアリング・飯田鉄工JV	⑨	道整24-0061	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）広瀬1号橋下部工事（一部債務）（余7）	R7.2.28～R8.8.13	飯塚工業
③	道整24-0009	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路工事その1（一部債務）（余7） 完成	R6.8.26～R8.2.23	芦沢組土木	⑩	道整24-0069	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）唐柏2号橋下部工事（一部債務）（余7）	R7.3.31～R8.12.11	芦沢組土木
④	道整24-0019	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路工事（一部債務）	R6.9.7～R8.3.13	早野組・望月組土木JV	⑪	道整24-0070	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）広瀬2号橋下部工事（一部債務）（余7）	R7.3.31～R8.4.30	矢崎興業
⑤	道整24-0034	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川第一号橋上部工製作・架設工事（一部債務）	R6.12.19～R10.1.29	横河フリッジ・高田機工・飯田鉄工JV	⑫	道整25-0001	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）笛吹高架12号橋外上部工製作・架設工事（一部債務）	R7.10.10～R11.2.14	飯田鉄工・三井住友建設鉄構エンジニアリング・横河フリッジJV
⑥	道整24-0046	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）唐柏3号橋下部工事（一部債務）（余7）	R7.2.25～R8.8.24	飯塚工業	⑬	道整25-0011	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路工事その1（一部債務）（余7）	R7.9.1～R9.1.22	風間興業
⑦	道整24-0052	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）シブ橋床版工事（明許）（余7） 完成	R7.2.4～R8.3.13	早野組	⑭	道整25-0012	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）笛吹高架16号橋下部工事	R7.9.3～R9.1.14	飯塚工業

※R7.12.31時点 赤字：R7.10.31時点より追加箇所

令和7年度 新山梨環状道路(東部区間2期) 工事一覧

No.	契約番号	工事名	工期	受注者	No.	契約番号	工事名	工期	受注者
⑯	道整25-0013	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 東油川ランプ橋(仮称)下部工事	R7.9.3 ～ R8.7.29	友愛工業	⑰	新環状25-0046	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 潟平等川大橋舗装工事(余7)	R7.11.18 ～ R8.3.13	日東建設
⑯	道整25-0014	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 道路工事 その2(一部債務)(余7)	R7.9.3 ～ R8.11.6	飯塚工業					
⑰	道整25-0022	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 道路工事 その3(一部債務)(余7)	R7.10.1 ～ R9.3.19	芦沢組土木					
⑱	道整25-0023	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 落合1号橋床版工事(一部債務)	R7.10.28 ～ R8.6.30	大新工業					
⑲	道整25-0025	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 落合4号橋床版工事(一部債務)	R7.10.28 ～ R8.6.25	望月組土木					
⑳	新環状25-0034	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 道路工事 その4	R7.9.25 ～ R8.3.13	芦沢組土木					
㉑	新環状25-0035	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 東油川高架橋舗装工事(余7)	R7.10.20 ～ R8.3.13	地建工業					

※R7.12.31時点 赤字: R7.10.31時点より追加箇所


～現場進捗状況写真～

令和7年12月19日撮影

I




II

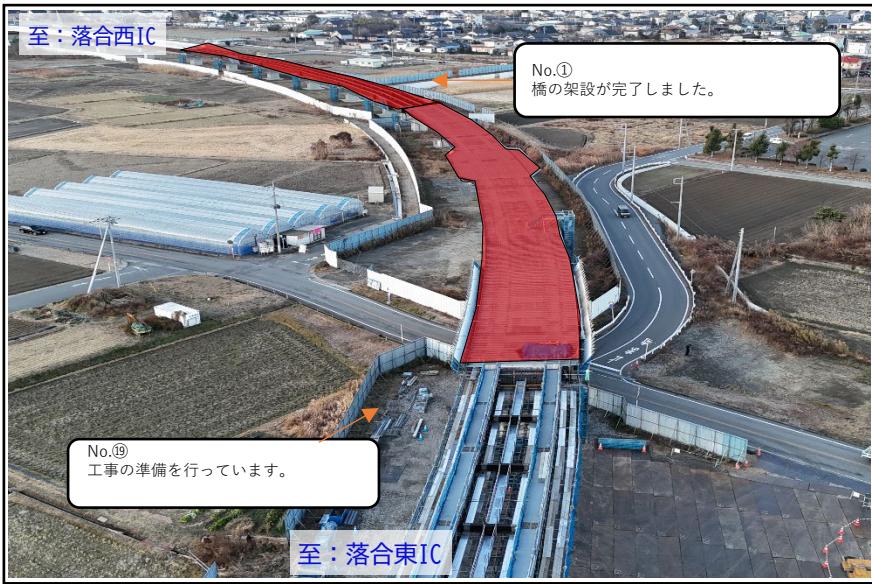

III



IV

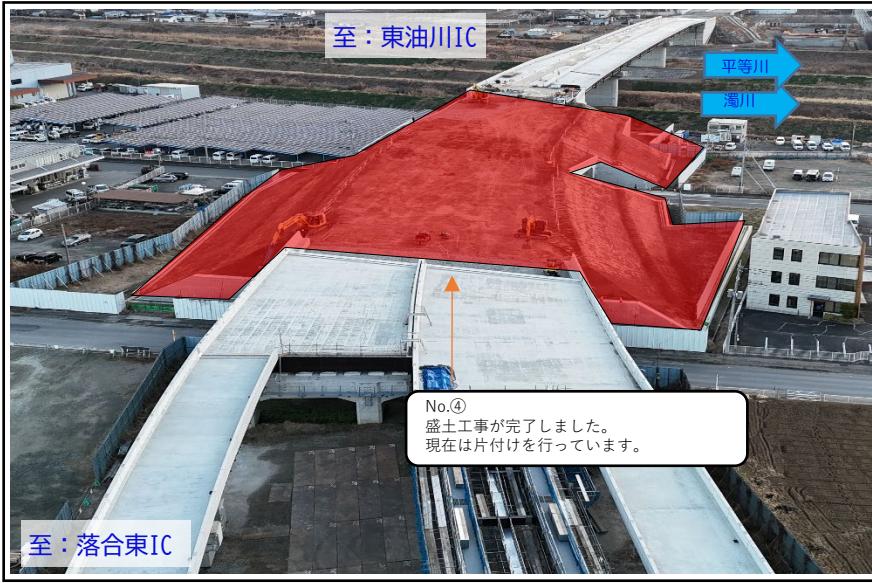


～現場進捗状況写真～

令和7年12月19日撮影


V




VI

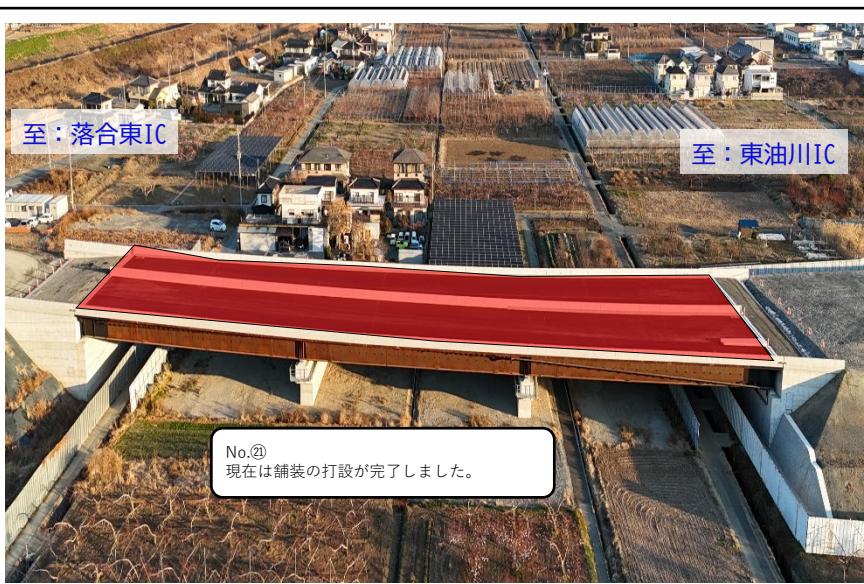

VII

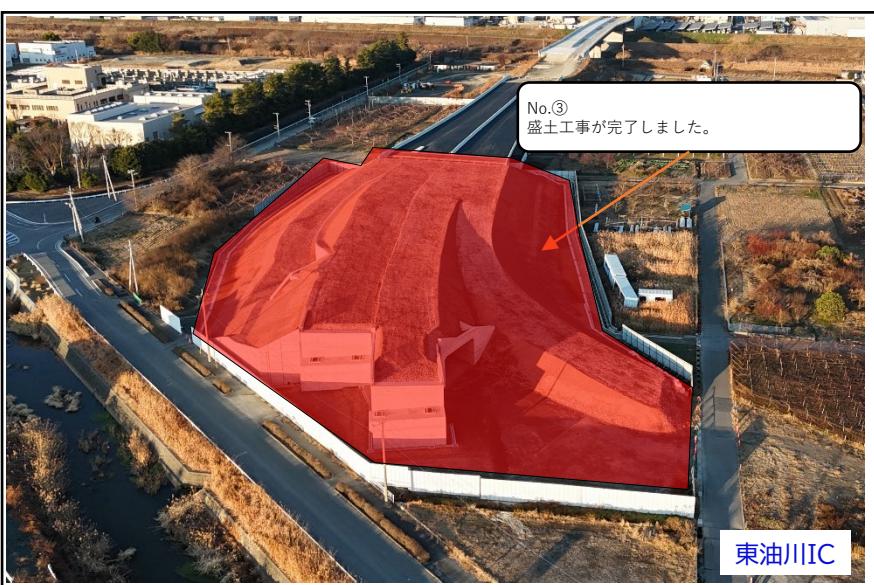

VIII

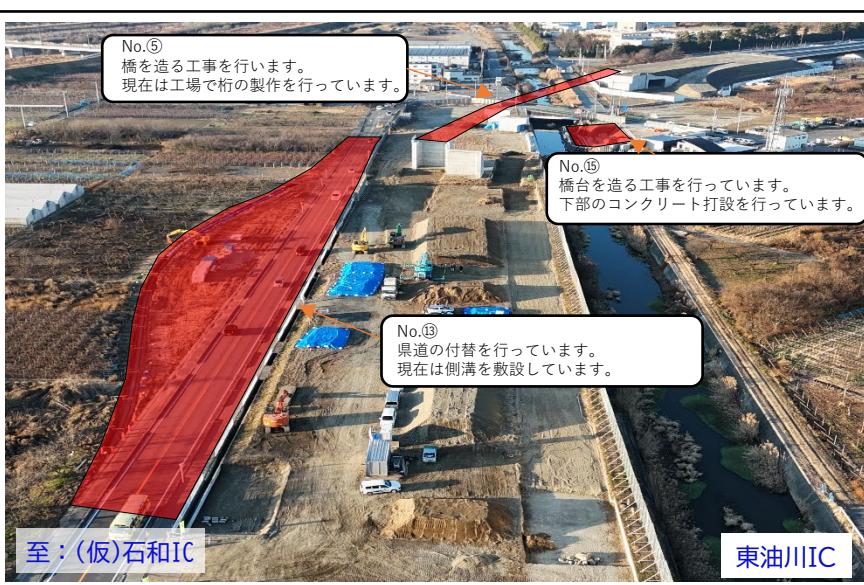

～現場進捗状況写真～

令和7年12月19日撮影

IX



X



XI



XII



～現場進捗状況写真～

令和7年12月19日撮影

13




14



15



XII



～設計・用地測量等の進捗状況～

甲府市：桜井町

【進捗狀況】

- ・橋梁予備設計完了
- ・地質調査一部完了
- ・用地測量完了
- ・橋梁詳細設計完了
- ・路線測量完了
- ・用地交渉実施中

(仮)桜井JCTランプ部

※本線については国土交通省事業範囲



甲府市：落合町, 下鍛冶屋町, 白井町
笛吹市：石和町東油川

【進捗狀況】

- ・予備設計完了
- ・詳細設計完了
- ・用地測量調査完了
- ・用地交渉完了
- ・工事実施中

笛吹市：石和町井戸,石和町砂原,
石和町河内,石和町小石和

【進捗狀況】

- ・予備設計完了
- ・詳細設計実施中
- ・用地調査完了
- ・用地交渉実施中
- ・工事実施中

笛吹市：石和町小石和,石和町唐柏,
石和町広瀬

【進捗狀況】

- ・側道詳細設計完了
- ・橋梁予備設計完了
- ・用地測量調査完了
- ・工事実施中
- ・橋梁詳細設計実施中
- ・地質調査実施中
- ・用地交渉完了

笛吹市：石和町広瀬 【進捗状況】

• 側道詳細

- ・橋梁詳細設計実施中
- ・用地調査完了
- ・用地交渉完了
- ・工事実施中

※各名称（専門用語）や完成までの流れについては次頁「東部区間の事業の流れ」を参照

◆東部区間の事業の流れ

