

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

道路改良工事（一部債務）

（小曲町22工区）

日頃より、地域の皆様におかれましては工事へのご理解とご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。

現在、小曲22工区では、工事区間全体の盛土を施工しております。
盛土の進捗は、半分程度終了しました。引き続き8月下旬頃まで盛土の施工を行います。

安全第一で1日も早い工事の完成を目指してまいりますので、今後ともご協力の程をよろしくお願いいたします。

工 期 令和元年9月10日～令和2年11月13日
工事概要 道路改良工事 L=251m
盛土工 V=55,500m³ 地盤改良工(中層混合処理工) V=2,302m³
補強土壁工 H=2.4～4.2m A=130m³ カルバート工 N=2基

工事進捗率 61.2%(6月末日)



長田組土木株式会社

山梨県甲府市飯田4丁目10-27
TEL:055-231-1111(代表)
TEL:055-231-1093(土木部直通)
現場代理人:相馬 英人


国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）
道路改良工事その1（一部債務）



日頃より、山梨県の道路事業にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
この度、甲府市小曲町地内にて新環状道路建設を行っております。

車両の通行等、皆様方には何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、工事関係者一同鋭意努力し、騒音・災害防止・交通安全等に細心の注意を払う所存です。
どうぞよろしくお願い致します。

上空より撮影(令和2年6月25日現在)

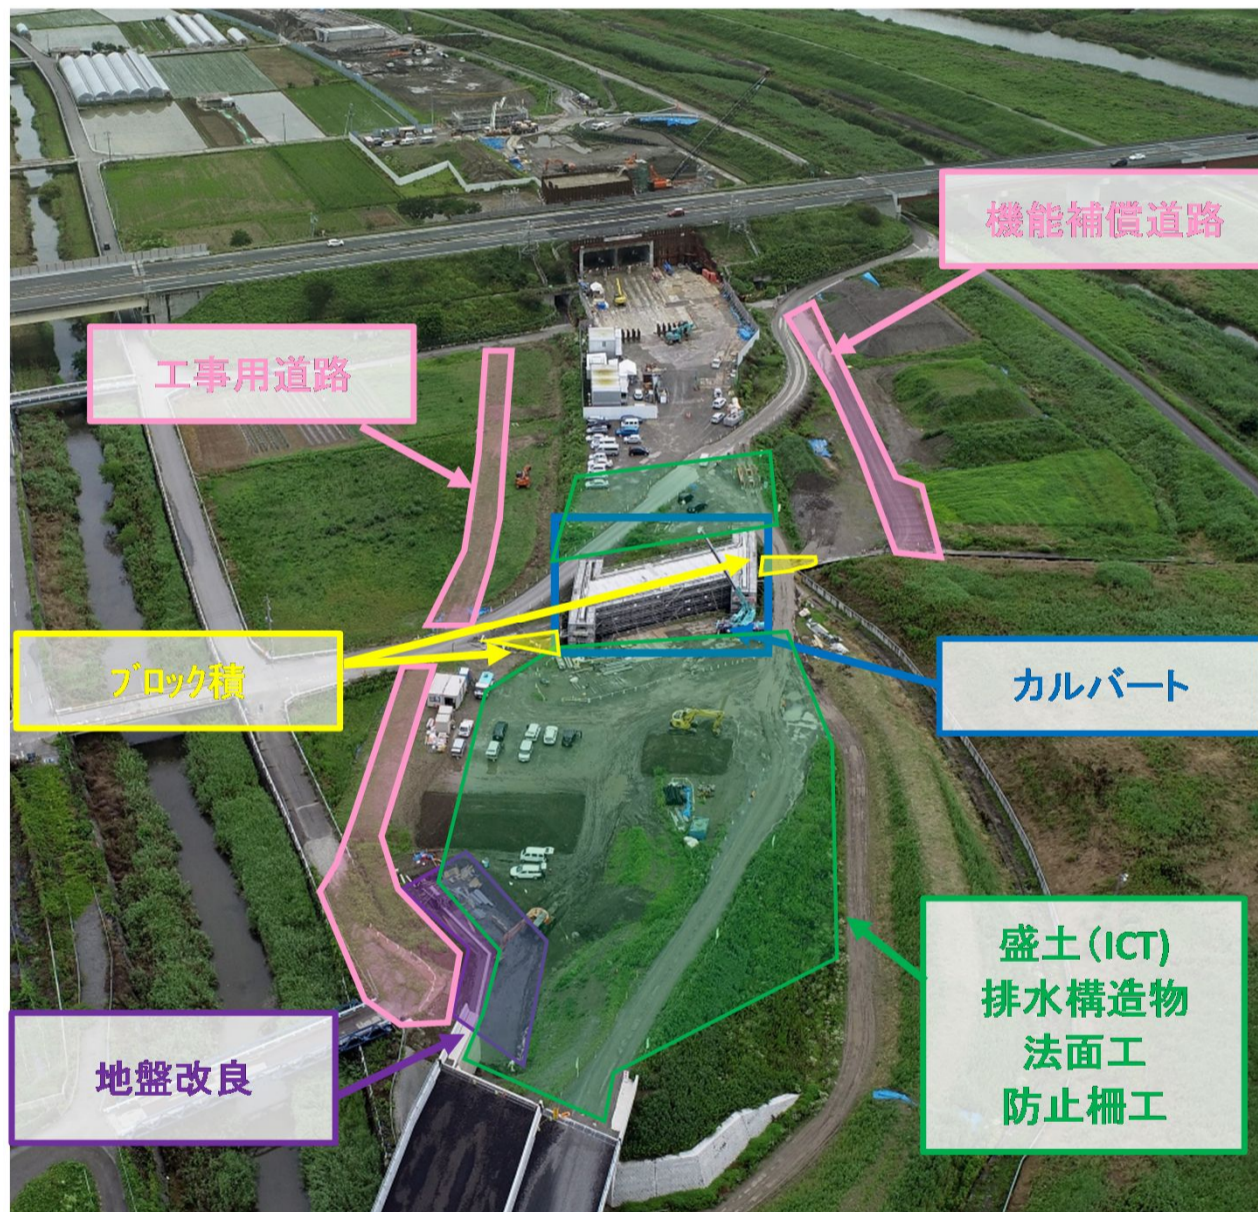

工 期	:	令和元年 12月 24日	~	令和 3年 1月 20日
主な工事概要	:	路体盛土工 V=24,800m ³		路床盛土工 V=3,500m ³
		地盤改良工 V=2,206m ³		補強土壁工 A=207m ²
		カルバート工 n=1基		仮設工 一式
工事進捗状況	:	令和 2年 6月末時点		40.5%
受 注 者	:	株式会社 早野組		
		現場代理人 望月 慶介		



真心と確かな技術

株式会社 早野組

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務)

暑さ厳しき折ではございますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
これからいっそう暑さは厳しくなります。地域の皆様方におかれましては
くれぐれも体調管理にはお気をつけください。

現在、当工事においては場所打函渠の作業を行っています。
8月中には函渠を完了させ、本格的な盛土作業に入っていく予定です。
天候に左右されることもあるとは思いますが、早期完了するべく最善を
尽くしますので、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。

【 上空からドローンにて現場を撮影 】



工事概要

道路改良工事 L=411m
盛土工 V=50,420m³
地盤改良工 V=5,392m³
補強土壁工 A=174m²
場所打函渠工 N=1箇所
仮設道路工 1式

工期

令和 1年12月24日
～令和 3年 3月15日

工事進捗率 30%(6月末時点)

 齋藤建設株式会社

山梨県甲府市青沼二丁目11-22 TEL 055-233-910 FAX 055-233-6382

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称) 橋梁工事 (一部債務)

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとうございます。

現在、A1橋台において場所打杭工事を行っています。
工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。
引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

● 工 事 概 要

プレテンション方式高強度PC床版橋 L=18.0m W=18.25m
逆T式橋台 N=2基 H=9.2m
場所打杭基礎 φ1200 L=31.5~32.0m N=34本

工 期 : 令和 2年 2月26日 ~ 令和 3年 3月15日

工事進捗状況 : 6月末時点 17.0%



施 工 会 社

国際建設・望月組土木 国道140号(新山梨環状道路)西下条本線橋工事共同企業体
