


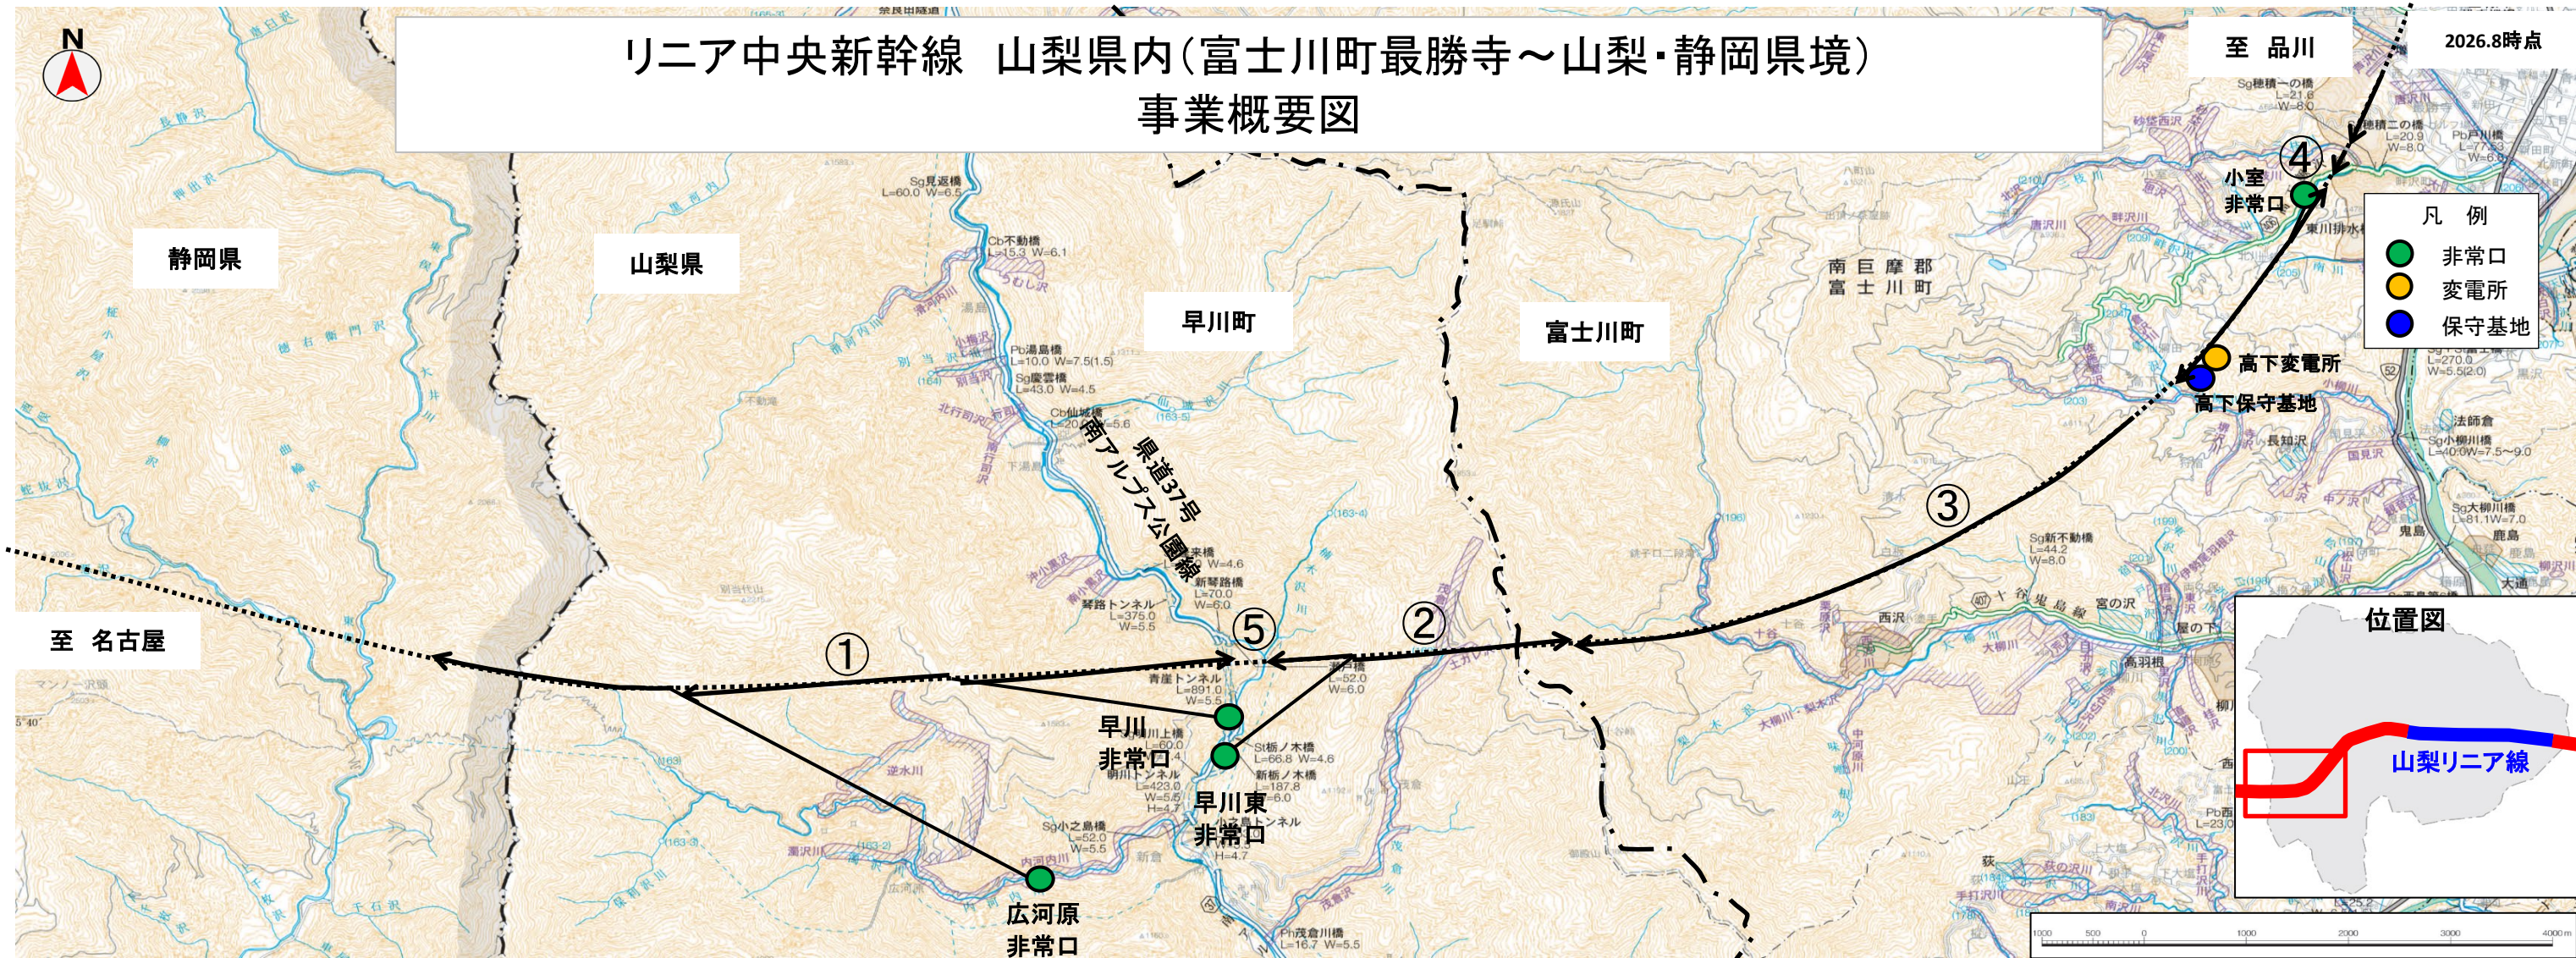

市町村名	早川町					富士川町						
構造物	高下変電所											
	高下保守基地											
	広河原 南アルプストンネル (山梨工区) 約7,700m (うち山梨区間約6,600m) (うち静岡区間約1,100m) 早川 早川橋梁 早川東 (西工区)約2,600m 第四南巨摩トンネル 約8,600m (東工区)約6,000m 橋梁 第三南巨摩トンネル 約2,500m 小室 畔沢川橋梁 第二南巨摩トンネル 約90m 橋三枝川 第一南巨摩トンネル 約710m											
	約400m		約300m		約110m		約50m					

工事進捗状況	③高下変電所											
	③高下保守基地											
	契約状況		①			⑤	②	③				④
橋りょう・トンネル等工事		先進坑、本坑掘削中				先進坑、本坑掘削中	保守基地連絡坑、本坑掘削中					

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	南アルプストンネル新設 (山梨工区)	本線トンネル7.7km、早川非常口・広河原非常口等	大成建設・佐藤工業・銭高組JV	H27.8.27～ R13.12.31	(早川非常口) H29.5 斜坑掘削完了 H30.3～ 本坑掘削開始 R5.3 先進坑掘削完了 (広河原非常口) R4.8 斜坑掘削完了 R4.8～ 先進坑掘削開始
②	第四南巨摩トンネル新設 (西工区)	本線トンネル2.6km、早川東非常口、保守基地連絡坑等	西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎建設JV	H28.7.20～ R13.12.31	(早川東非常口) R4.6 斜坑掘削完了 R3.11～ 本坑掘削開始 R5.4～ 先進坑掘削開始
③	第四南巨摩トンネル新設 (東工区) ほか	本線トンネル6.0km、保守基地連絡坑、保守基地・変電所用地造成	大林組・鴻池組JV	R1.12.19～ R12.2.28	R3.12～ 本坑掘削開始 R3.12～ 保守基地連絡坑掘削開始
④	第三南巨摩トンネルほか新設	本線トンネル3.4km、小室非常口、本線橋梁 (三枝川橋りょう約50m、畔沢川橋りょう約110m)	大成建設・早野組JV	R2.11.16～ R10.11.30	(第一南巨摩トンネル) R5.10.13 第一南巨摩TN貫通 (第三南巨摩トンネル) R8.1～ 第三南巨摩TN掘削開始 (三枝川橋りょう) R6.1～ 施工中 (畔沢川橋りょう) R6.4～ 施工中 (小室非常口) R5.6～ 施工中
⑤	早川橋りょうほか新設	橋梁工事 (コンクリートアーチ橋、橋長400m)	大成建設・銭高組JV	R5.11.21～ R9.12.31	R5.12～ 施工中

凡例	工事	
	契約状況	工事
	未発注	未着手
	契約手続中等	実施中
	契約完了	完成
