

発行日：令和元年10月23日

新山梨環状道路通信

～10月 工事現場進捗状況～


資料提供 (仮称)落合西ランプ安全協議会
小曲町安全協議会
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合町)の東部区間1期(L=1.6km)の、工事の状況をお伝えいたします。
※残りの東部区間2期(約5.5km)は現在、詳細設計及び地元との交渉を進めています。

～東部区間1期 全体概要図～

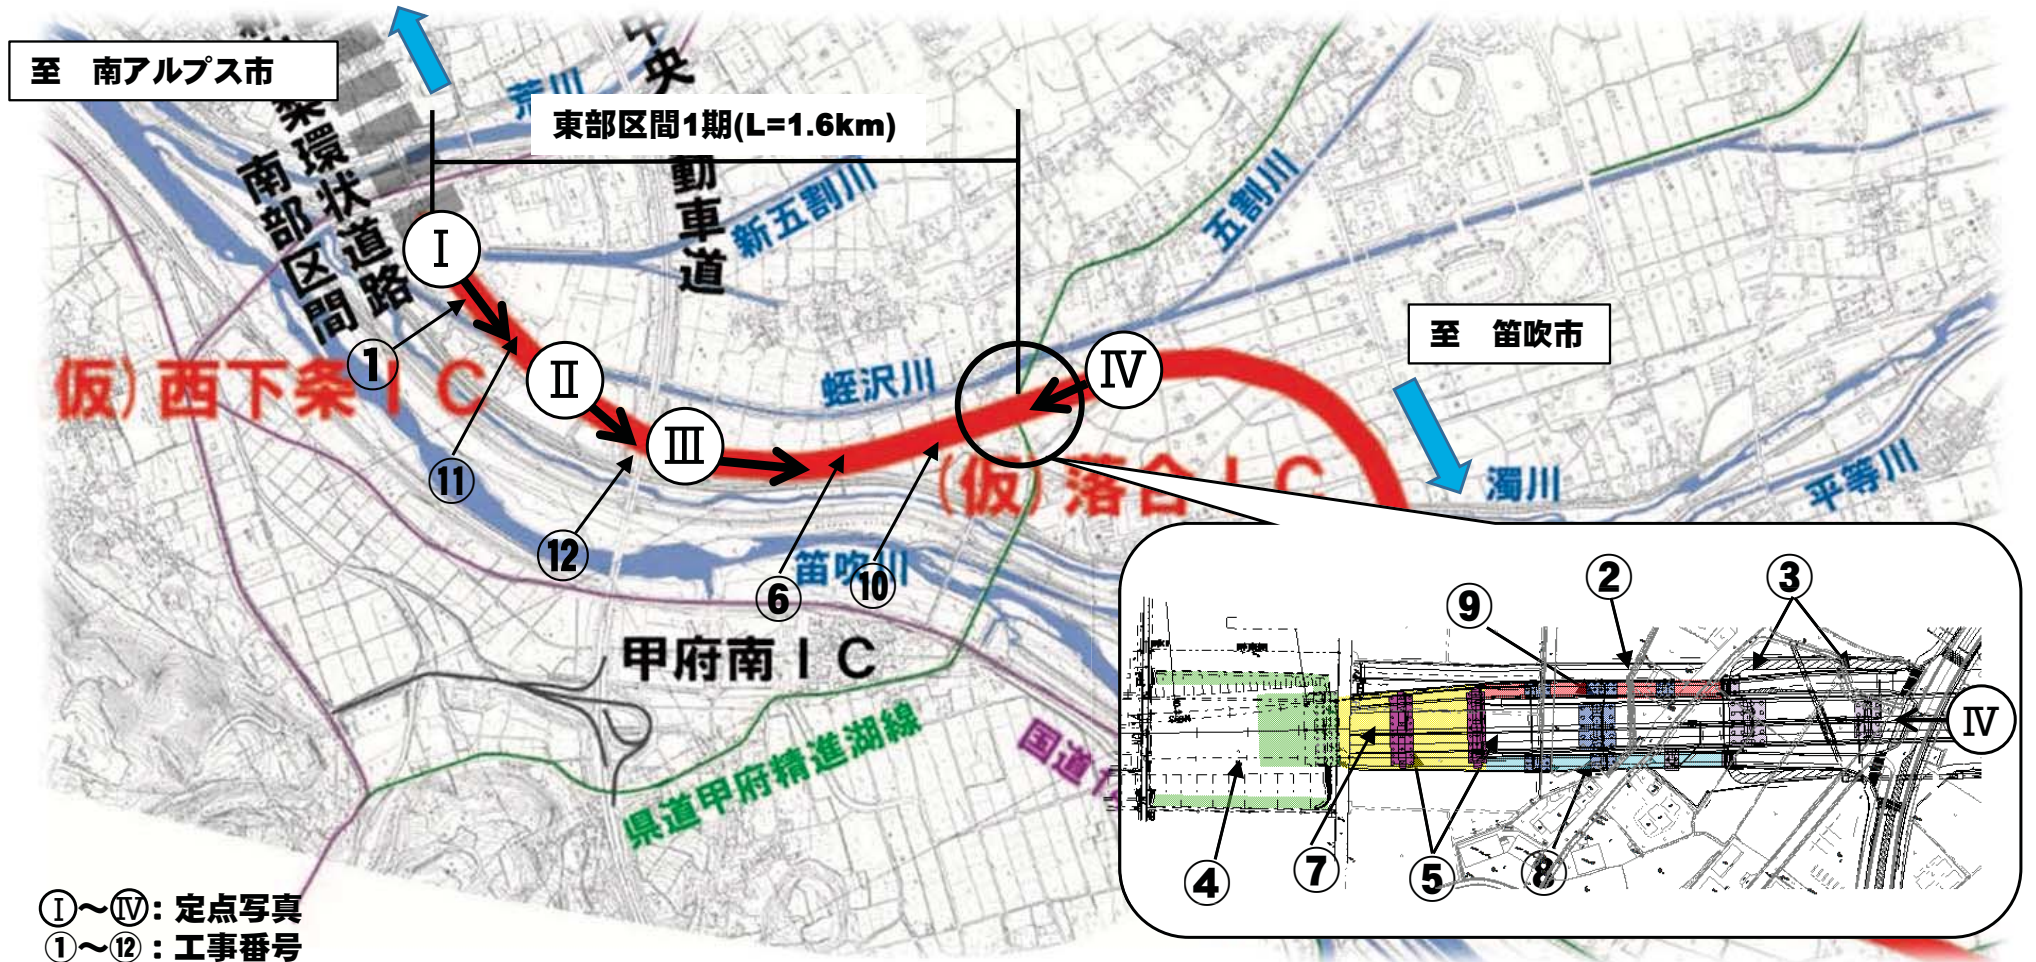

令和元年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

No.	契約番号	工事名	工期	受注者	No.	契約番号	工事名	工期	受注者
①	道整18-0015	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その1(明許)	2018/9/18 ~ 2020/1/31	雷藤建設(株)	⑦	道整19-0008	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債務)	2019/8/28 ~ 2020/12/15	飯田鉄工・植崎製作所JV
②	道整18-0026	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)(仮称)落合西ランプ橋梁下部工事その1(一部債務)	2018/11/15 ~ 2019/11/29	長田組土木 宏和建设JV	⑧	道整19-0009	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オンランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/5/29	(株)早野組
③	道整18-0027	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)(仮称)落合西ランプ橋梁下部工事その2(一部債務)	2018/11/13 ~ 2020/12/13	大新工業 中村建設JV	⑨	道整19-0010	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オフランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/5/29	(株)三枝組
④	道整18-0041	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)	2019/3/29 ~ 2020/1/31	雷藤建設(株)	⑩	道整19-0016	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/9/10 ~ 2020/11/13	長田組土木(株)
⑤	道整18-0042	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その2(一部債務)	2019/3/29 ~ 2019/11/29	国際建設(株)	⑪	環状19-0035	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)穂池大橋 舗装工事	2019/9/6~ 2020/1/17	地建工業(株)
⑥	道整19-0007	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/28	大新工業(株)	⑫	-	中央自動車道 甲府南地区函渠工工事	2017/9/21 ~ 2020/3/27	鉄建建設 大成ロテックJV

※R1.10.23時点

赤字：追加・変更(R1.8.8から)

～現場進捗状況写真～

2019年10月15日撮影

I 西下条IC付近



No.①
盛土作業も残りわずかとなり
現在は、水路を作っています。

II 中央自動車道付近



No.⑫
施工ヤードにて地下構造物(BOXカルバート)
の製作を行っております。

III 中央道から小瀬方面



黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所

No.⑥⑩
地盤改良工に先立ち、迂回路設置
や測量・調査を実施しております。

IV (仮)落合西IC付近



No.②③④⑤
一部の橋脚が出来上がり、現在は残りの橋脚の鉄筋組立とコンクリート
を打ち込んでいます。
