

発行日：令和2年1月15日

新山梨環状道路通信

～12月 工事現場進捗状況～


資料提供 東部1期工区安全協議会
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合町)の東部区間1期(L=1.6km)の、工事の状況をお伝えいたします。
※残りの東部区間2期(約5.5km)は現在、詳細設計及び地元との交渉を進めています。

～東部区間1期 全体概要図～

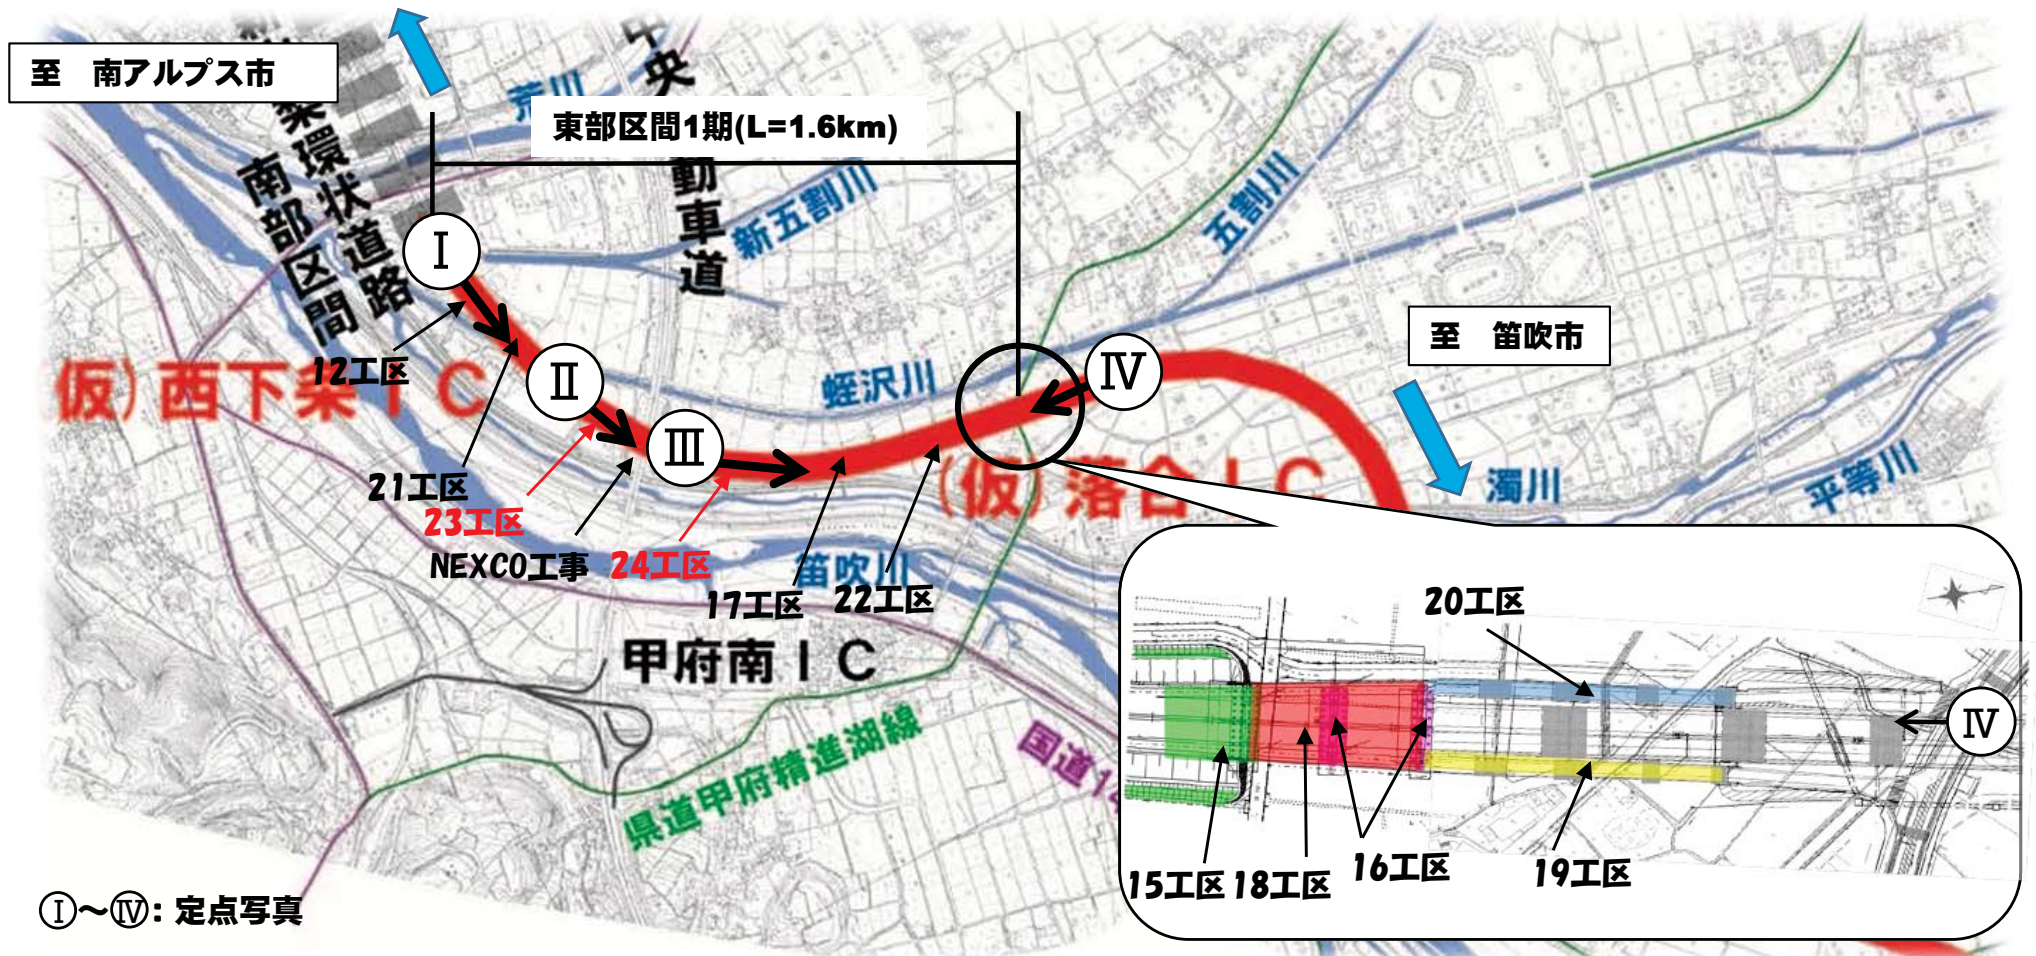

令和元年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
12工区	道整18-0015	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その1(明許)	2018/9/18 ~ 2020/1/31	齋藤建設(株)	20工区	道整19-0010	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オフランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)三枝組
15工区	道整18-0041	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その1(一部債務)	2019/3/29 ~ 2020/1/31	齋藤建設(株)	21工区	道整19-0016	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/9/10 ~ 2020/11/13	長田組土木(株)
16工区	道整18-0042	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁下部工事その2(一部債務)	2019/3/29 ~ 2020/2/17	国際建設(株)	22工区	環状19-0035	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)穂池大橋 舗装工事	2019/9/6~ 2020/2/28	地建工業(株)
17工区	道整19-0007	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/28	大新工業(株)	23工区	道整19-0037	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その1(一部債務)	2019/12/24 ~ 2021/1/20	(株)早野組
18工区	道整19-0008	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債務)	2019/8/28 ~ 2020/12/15	飯田鉄工・榑崎製作所JV	24工区	道整19-0038	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)道路改良工事その2(一部債務)	2019/12/24 ~ 2021/3/15	齋藤建設(株)
19工区	道整19-0009	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)落合西オンランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)早野組	NEXCO 工事	-	中央自動車道 甲府南地区函渠工工事	2017/9/21 ~ 2020/3/27	鉄建建設大成ロテックJV

※R2.1.15時点

赤字：追加・変更(R1.10.23時点より)

～現場進捗状況写真～

2019年12月5日撮影

I

西下条IC付近



No.①
盛土が完成し、ランプ（出入口）の形が見えてきました。

II

中央自動車道付近



No.⑫
中央道の下にトンネルを作る工事中です。現在、地下構造物(BOXカルバート)の製作中です。

III

中央道から小瀬方面



黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所

No.④⑧
環状道路下を通るためのBOXカルバートの工事が始まりました。完成後、土を盛っていきます。

IV

(仮)落合西IC付近



No.②③⑤
写真手前では橋の柱が無事完成しました。これから、完成した橋脚の上に橋を作っていきます。
