

◎ 県営土地改良事業計画の変更後の計画の概要の公告

土地改良法（昭和二十四年法律第九十五号）第八十八条第一項の規定に基づき、県営土地改良事業（畑地帯総合整備事業「担い手支援型」山梨西部地区）計画を変更したいので、同項の規定により変更後の計画の概要等を公告する。

令和八年三月十一日

山梨県知事 長 崎 幸 太 郎



令和7年度 計画変更

水利施設等保全高度化事業(特別型)

土地改良事業計画概要書

やまなしせいぶちく  
山梨西部地区

(山 梨 県)

土地改良事業計画概要書

水利施設等保全高度化事業（特別型） 山梨西部地区

第1章 目 的

本地区は、山梨市南部の笛吹川右岸に位置し、ブドウ、モモ、を中心とした果樹生産地域である。地区内の受益農地は未整備で小規模で山際は急峻な圃場となっており営農、維持管理に多大な労力を要している。近年、農業従事者の高齢化、後継者不足により耕作放棄地も目立って来ている状況にある。

よって、効率的な営農を行うための条件整備が急務であり、本事業により生産基盤の整備と担い手への農地の集積を行い農地の有効活用を図り、生産性の向上と農業経営の安定化により、地域農業の維持・向上を図る。

第2章 地区の所在及び現況

1. 地域の所在

山梨県 山梨市（山梨西部地区）

2. 現況及び地目別地積

本地区は、山梨市南部の笛吹川右岸に位置し、ブドウ、モモ、を中心とした果樹生産地域である。地区内の受益農地は未整備で小規模で山際は急峻な圃場となっており営農、維持管理に多大な労力を要している。近年、農業従事者の高齢化、後継者不足により耕作放棄地も目立って来ている状況にある。

(単位：ha)

| 種別 |         | 地目 |   |      |     |      |      |     |     | 計    |
|----|---------|----|---|------|-----|------|------|-----|-----|------|
|    |         | 田  | 畑 | 樹園地  | 休耕地 | 小計   | 山林原野 | 道水路 | その他 |      |
| 現況 | 事業区域全体  | 0  | 0 | 12.5 |     | 12.5 |      |     |     | 12.5 |
| 計画 | 農業用排水受益 | 0  | 0 | 2.7  |     | 2.7  |      |     |     | 2.7  |
|    | 区画整理受益  | 0  | 0 | 12.5 |     | 12.5 |      |     |     | 12.5 |
|    | 畑かん施設受益 | 0  | 0 | 0    |     | 0    |      |     |     | 0    |
|    | 重複面積    | 0  | 0 | -2.7 |     | -2.7 |      |     |     | -2.7 |
|    | 計       | 0  | 0 | 12.5 |     | 12.5 |      |     |     | 12.5 |

### 第3章 基本計画

#### 1 事業の種類び受益面積

(単位：ha)

| 事業の種類             | 事業の種類の詳細 | 受益面積 | 摘要 |
|-------------------|----------|------|----|
| 水利施設等保存高度化事業（特別型） | 農業用排水路   | 2.7  |    |
| 水利施設等保存高度化事業（特別型） | 区画整理     | 12.5 |    |
| 水利施設等保存高度化事業（特別型） | 畑かん施設    | 0.0  |    |
|                   | (重複面積)   | -2.7 |    |
| 計                 |          | 12.5 |    |

#### 2 各事業別の主要工事計画の概要

##### ・農業用排水路

| 項目<br>名称 | 受益面積(ha)          | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 総延長(km) | 構造      | 勾配    | 備考 |
|----------|-------------------|----------------------------|---------|---------|-------|----|
|          | 事業名               |                            |         |         |       |    |
|          | 水利施設等保存高度化事業（特別型） |                            |         |         |       |    |
| 水路1号     | 2.7               | 0.688                      | 0.15    | 積ブロック水路 | 1/100 |    |
|          |                   |                            |         |         |       |    |

##### ・農道

該当無し

##### ・区画整理

| 長辺×短辺<br>(m) | 区画面積<br>(ha) | 全体面積<br>(ha) | 割合<br>(%) | 田差<br>(m) | 備考 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 換地計画による      | 12.5         | 12.5         | 100.0     | —         |    |

##### ・鳥獣害侵入防止施設

該当無し

## 第4章 工事又は管理の要領

### 1 工期

令和2年度～令和10年度（9年）

### 2 施設の予定管理者

| 施設名称   | 種類 | 規格等      | 施設の予定管理者 |
|--------|----|----------|----------|
| 農業用排水路 | 水路 | L=150m   | 山梨市      |
| 区画整理   | 区画 | A=12.5ha | 受益者      |
| 畑かん施設  | 水路 | -        | -        |

## 第5章 換地計画の概要

### 1. 換地計画を作成する上での基本的な考え方

本地区の換地計画は、農地の改良、開発、保全及び農地の集団化を目的とすると共に、用途、地積、等位その他の自然条件を総合的に勘案し、従前の土地に照応するように定めるものとする。

### 2. 換地区の設定

#### (1) 換地区の名称、所在、面積

| 換地区名 | 換地工区の所在 | 面積(ha) |
|------|---------|--------|
| 落合工区 | 山梨市 落合  | 12.5   |
|      |         |        |
|      |         |        |
|      |         |        |

## 第6章 費用の概算

事業費 1,253,100千円 (事務費除く)

## 第7章 効 用

総費用総便益比 1.07

(千円)

| 効果項目        | 年効果額   | 備考 |
|-------------|--------|----|
| 作物生産効果      | 30,197 |    |
| 品質向上効果      | 5,424  |    |
| 営農経費節減効果    | 30,909 |    |
| 維持管理費節減効果   | △ 18   |    |
| 国産農産物安定供給効果 | 3,721  |    |
|             |        |    |
|             |        |    |
| 計           | 70,233 |    |

## 第8章 他事業との関連

該当なし

## 第9章 計画概要図

① 計 画 平 面 図                      別 添


# 畑地帯総合整備事業 山梨西部地区 変更計画平面図

| 凡例  |          |
|---|----------|
|  | 県道・主要地方道 |
|  | 用排水路(計画) |
|  | 区画整理(計画) |
|  | 計画減      |

Ⓜ 変更 排水路1号 L=182m→150m

Ⓜ 変更 工変 区画整理1 A=13.5ha→12.5ha

|        | 山梨高校   |           |           | 山梨西部 |            |            |         |
|--------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|---------|
|        | 路線名    | 変更前事業量(m) | 変更後事業量(m) | 増減   | 変更前事業量(千円) | 変更後事業量(千円) | 増減      |
| 用排水路   | 排水路1号  | 182       | 150       | -32  | 19,800     | 20,800     | 1,000   |
|        | 計      |           |           | -32  |            |            | 1,000   |
| 区画整理   | 区画整理   | 13.5      | 12.5      | -1   | 742,700    | 1,038,700  | 296,000 |
|        | 計      |           |           | -1   |            |            | 296,000 |
| 畑地かんがい | 畑地かんがい | 8.8       | 0         | -8.8 | 82,900     | 0          | -82,900 |
|        | 計      |           |           | -8.8 |            |            | -82,900 |

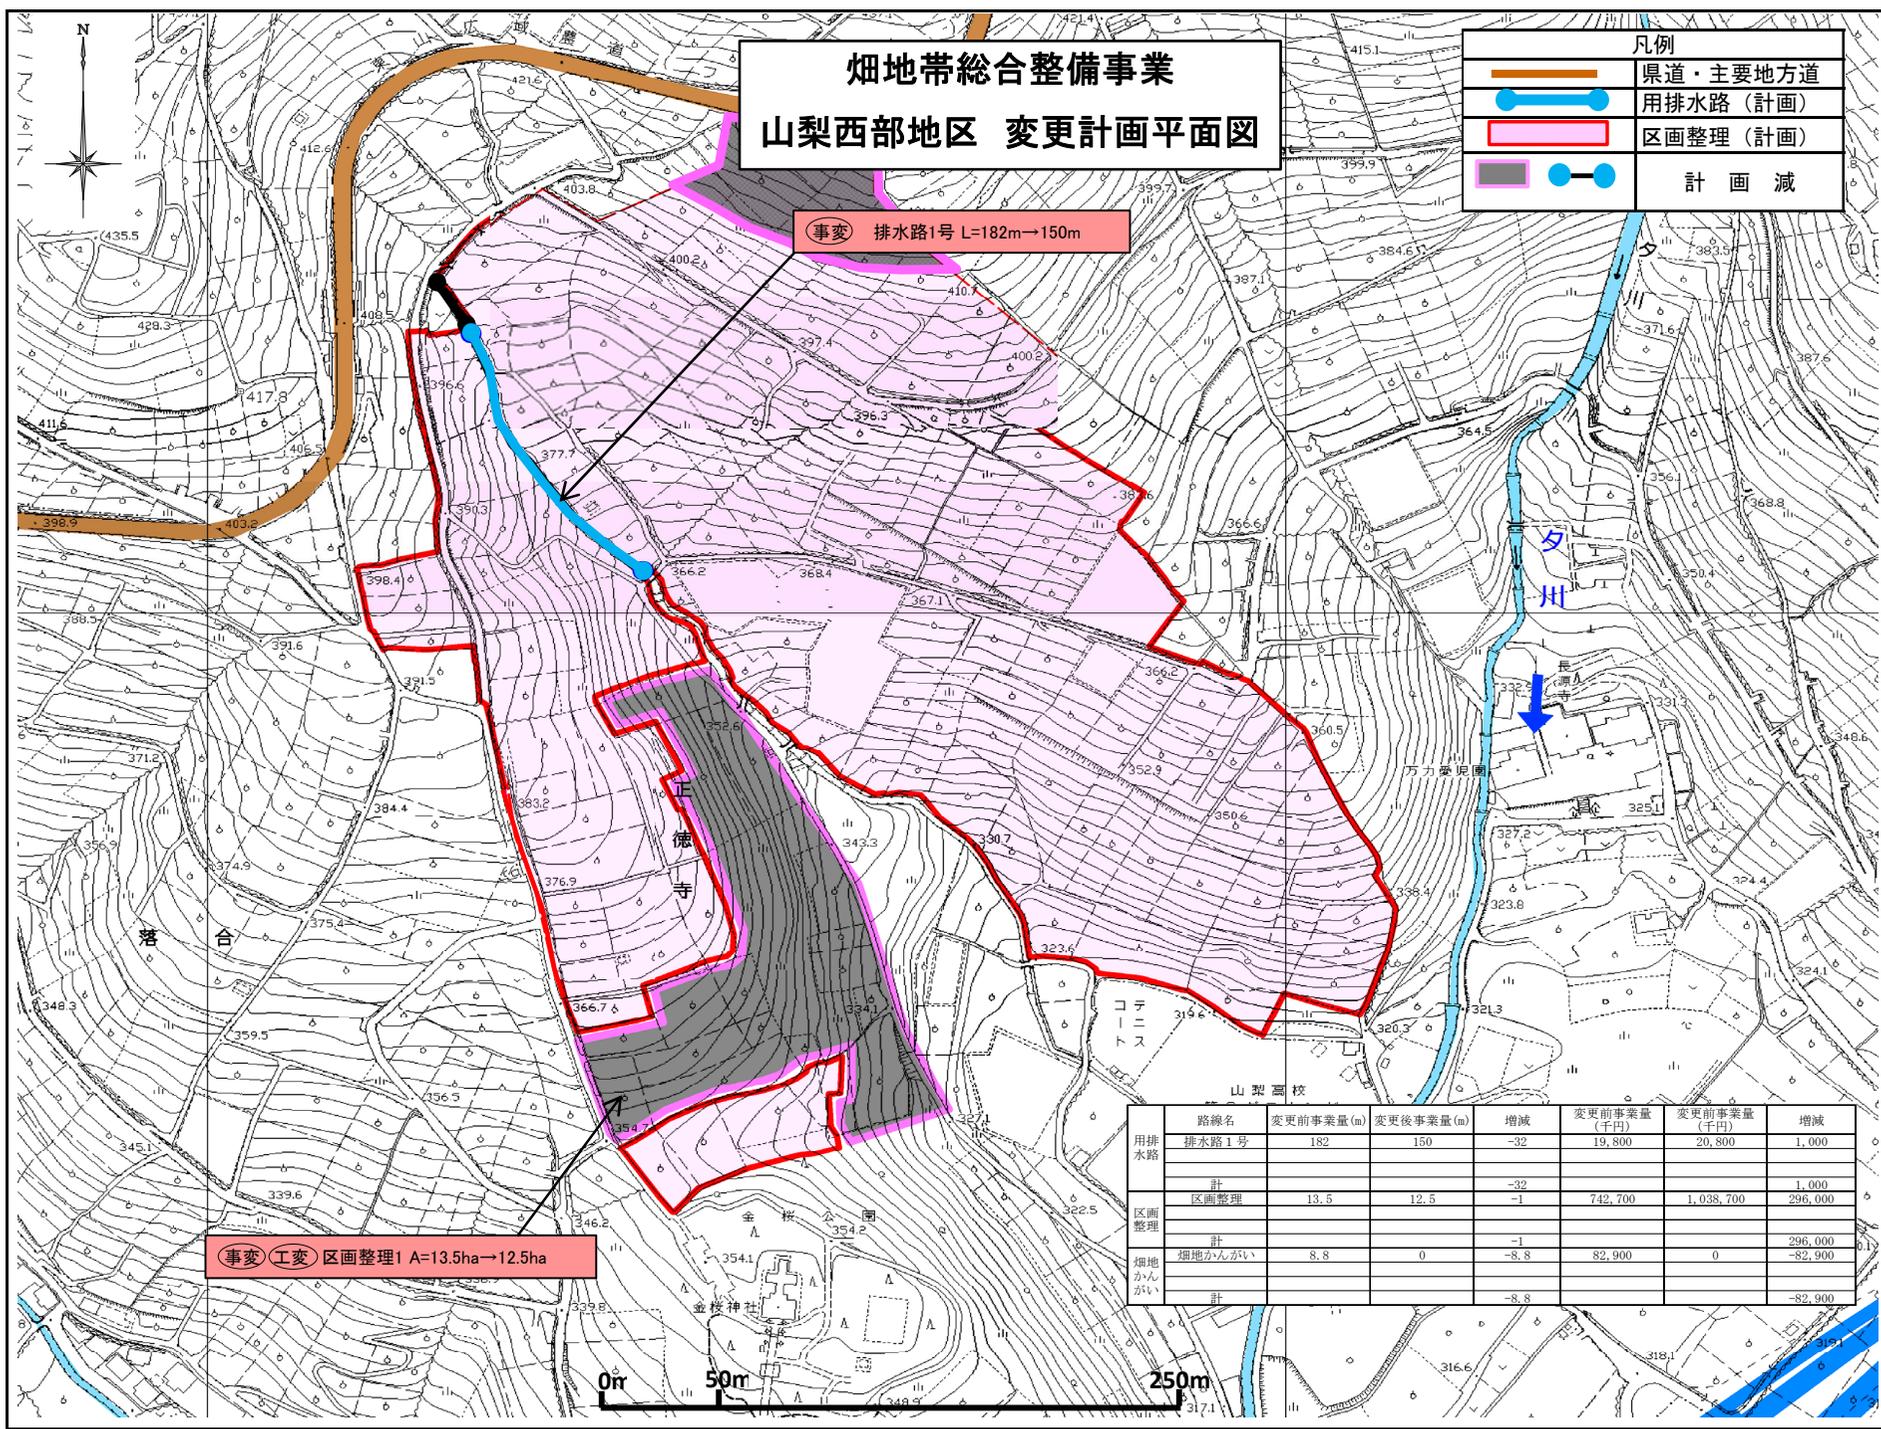

(別記様式第2号)

|                            |  |                                  |                              |                      |   |
|----------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 地区名                        | やまなしせいぶ<br>山梨西部  | 局名                               | 関東農政局                        | 所在地                  | 山梨市万力地内   |
| 事業名                        | 畑地帯総合整備事業 (担い手支援型)   |                                  |                              |                      |   |
| 事業の経緯                      | 採択年度   | 着工年度                             | 当初計画確定                       | 第1回(令和6年度)<br>変更計画確定 | 令和5年度までの<br>進捗率(事業費ベース)   |
|                            | 令和2年度  | 令和2年度                            | 令和2年3月18日                    |                      | 39.8 % ( 499,000 千円)  |
| 項目                         | 現計画  | 変更計画                             | 増△減                          | 備考                   |   |
| 受益面積                       | 13.5 ha  | 12.5 ha                          | △ 1.0 ha                     |                      |   |
| 受益者数                       | 75 戸   | 72 戸                             | △ 3.0 戸                      |                      |   |
| 事業費                        | 931,700 千円<br>( 847,000 ) 千円   | 1,378,300 千円<br>( 1,253,000 ) 千円 | 446,600 千円<br>( 406,000 ) 千円 | 事務費込み                |   |
| 投資効率                       | 1.28   | 1.16                             | △ 0.12                       |                      |   |
| 所得償還率                      | 1.0%   | 0.4%                             | △ 0.5%                       |                      |   |
| 工期                         | 令和2年度～令和7年度  | 令和2年度～令和10年度                     |                              |                      |   |
| 変更の要旨                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 主要工事計画 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 畑かん施設工の減 既存施設の移設で対応可能となったことによる、新設面積の減</li> <li>・ 区画整理の工法変更</li> </ul> </li> <li>○ 事業費の変動 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総事業費 10%以上の増 事業量変更及び工法変更による事業費の増</li> </ul> </li> </ul> |                                  |                              |                      |   |
| 変更項目及び要件                   | 項目   | 現計画                              | 変更計画                         | 増△減                  | 増△減の内訳又は理由  |
| 主要工事計画<br>[畑かん施設の20%以上の増減] | 畑かん施設工   | 8.8 ha                           | 0.0 ha                       | △ 8.8 ha             | 既存施設の移設で対応可能となったため、<br>新設面積が減となり、計画を廃止<br>$8.8 / 8.8 * 100 = 100\% > 20\%$  |
| 事業費の変動<br>[10%以上の増減]       |  | 847,000                          | 1,253,000                    | 406,000              | 自然増 18,800 千円<br>事業量変更 34,600 千円<br>工法変更 352,600 千円<br>その他 0 千円<br>変動率 $\frac{1,253,000 - (847,000 + 18,800)}{847,000}$<br>= 45.7 % > 10% |


計 画 変 更 概 要 表

|           |             |           |        |         |           |        |        |      |       |      |
|-----------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|------|-------|------|
| 地方農政局     | 関 東         | 県名        | 山 梨    | 地区名     | 山 梨 西 部   |        |        |      |       |      |
| 所在地       | 山 梨 市 落 合 外 |           |        | 事業目的    | 畑地帯総合整備事業 |        |        |      |       |      |
| 採択年度      | 令和2年度       | 着工年度      | 令和2年度  | 計画確定年月日 | R2.3.18   |        |        |      |       |      |
| 受益面積 (ha) | 変更前         |           |        |         | 変更後       |        |        |      |       |      |
|           | 水田          | 畑         | 樹園地    | 市街地・他   | 計         | 水田     | 畑      | 樹園地  | 市街地・他 | 計    |
|           | 0.0         | 0.0       | 13.5   | 0.0     | 13.5      | 0.0    | 0.0    | 12.5 | 0.0   | 12.5 |
| 事業費 (千円)  | 本事業         |           | 関連事業   |         | 計         |        | 10a当たり |      |       |      |
|           | 変更前         | 847,000   | 国・県営   | その他     | 847,000   | 6,274  |        |      |       |      |
|           | 変更後         | 1,253,000 | -      | -       | 1,253,000 | 10,024 |        |      |       |      |
| 稲転率 (%)   | 変更前         | -         | 農振地域指定 |         |           |        |        |      |       |      |
|           | 変更後         | -         | 農振計画策定 |         |           |        |        |      |       |      |

|      |            |         |          |         |
|------|------------|---------|----------|---------|
| 計画内容 | 変更前        |         | 変更後      |         |
|      | 1 農業用排水路   | 182 m   | 1 農業用排水路 | 150 m   |
|      | 2 区画整理     | 13.5 ha | 2 区画整理   | 12.5 ha |
|      | 3 畑地かんがい施設 | 8.8 ha  |          |         |

|      |          |         |        |        |         |        |
|------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 主要工事 | 事業名      | 事業量     | 主要工事諸元 | 事業名    | 事業量     | 主要工事諸元 |
|      | 農業用排水路   | 182 m   |        | 農業用排水路 | 150 m   |        |
|      | 区画整理     | 13.5 ha |        | 区画整理   | 12.5 ha |        |
|      | 畑地かんがい施設 | 8.8 ha  |        |        |         |        |

(地区略図)

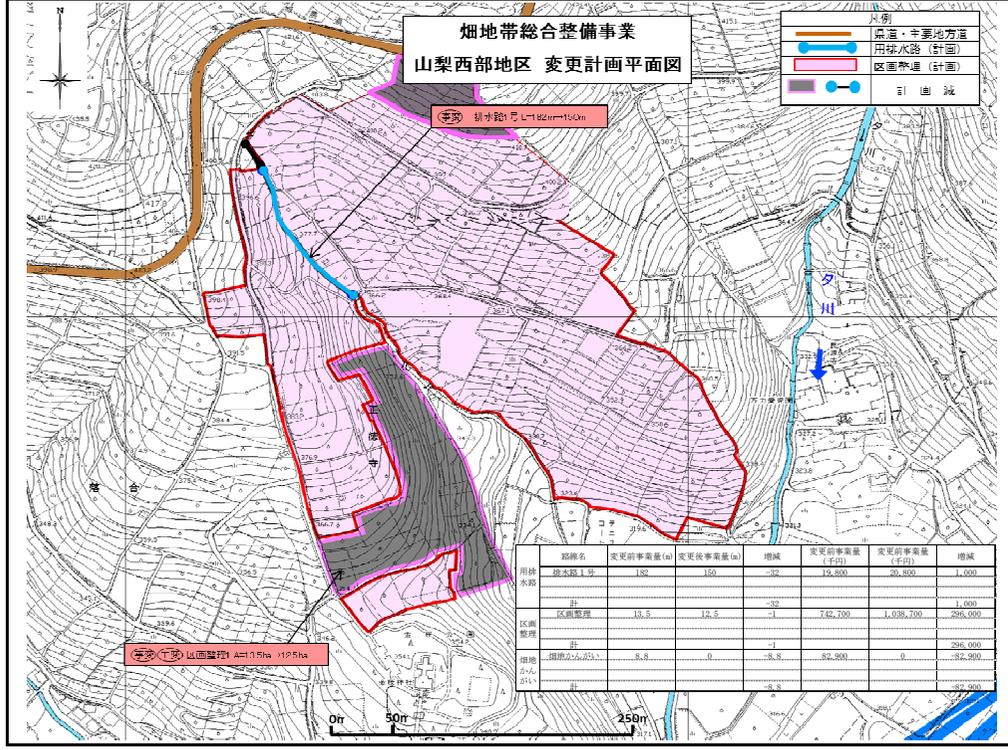

|     |     |      |      |             |                 |       |           |
|-----|-----|------|------|-------------|-----------------|-------|-----------|
| 効果等 | 変更前 | 作物名  | 増減要因 | 効果発生面積 (ha) | 10a 当たり 収量 (kg) |       | 単収増 (ton) |
|     |     |      |      |             | 現 況             | 計 画   |           |
|     |     | ぶどう  | 水害防止 | 6.1         | 1,108           | 1,274 |           |
|     | もも  | 水害防止 | 3.8  | 1,274       | 1,465           | 191.0 |           |
|     | 変更後 | ぶどう  | 水害防止 | 5.8         | 1,030           | 1,185 | 155.0     |
|     |     | もも   | 水害防止 | 3.6         | 1,065           | 1,225 | 160.0     |

|             |        |        |         |           |
|-------------|--------|--------|---------|-----------|
|             | 現計画    | 変更計画   | 現計画     | 変更計画      |
| 作物生産効果      | 14,506 | 32,553 | 年総効果額   | 57,874    |
| 品質向上効果      | 10,312 | 6,079  | 年償還額    | 305       |
| 営農経費節減効果    | 31,346 | 32,778 | 総便益額    | 1,145,965 |
| 維持管理費節減効果   | △ 230  | △ 18   | 総費用総便益比 | 1.28      |
| 国産農産物安定供給効果 | 1,940  | 4,275  | 所得償還率   | 0.97      |

共同振分 該当なし





(様式-5)

計画変更の要旨

山梨西部地区

| 該 当 事 項  | 変 更 を 要 す る 理 由  | 増 減 内 容  |       |        |        |          |        |          | 備 考   |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|--|--|--|-------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 第3条2項<br>(2) 主要工事計画の変更<br>農林水産省告示第2172号<br>農林水産大臣が定める主要工事のうち<br>1<br>(2) 農業用排水路<br>イ (ア)<br>水路延長の20%以上の変更<br><br><br><br><br><br><br><br><br>(3) 農業用道路<br>イ (ア)<br>総延長の20%以上の変更  | 農業用排水路 該当無し<br><br>・現地測量及び現地精査の結果をふまえ、一部範囲において既設利用可能であることから事業量の減。<br><br><br><br><br><br><br><br><br>農道整備 該当無し | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業用排水路</td> <td>182 m</td> <td>18,000</td> <td>150 m</td> <td>20,800</td> <td>△ 32 m</td> <td>△ 17.6 %</td> <td>2,800</td> </tr> </tbody> </table>  |       |        |        |          |        |          |       | 工 種 | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  | 事 業 量 |     | 事 業 費 | 事業量   | 事業費 | 変 更 後 | 事業費   | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 | 農業用排水路 | 182 m | 18,000 | 150 m | 20,800 | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  | 工 種  | 変 更 前 |        | 変 更 後  |          | 事 業 量  |          | 事 業 費 |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  | 事業量   | 事業費    | 変 更 後  | 事業費      | 増 減    | 増 減 率    | 増 減   |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  | 農業用排水路   | 182 m | 18,000 | 150 m  | 20,800   | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800 |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  | 農業用排水路   |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水路1号</td> <td>182 m</td> <td>18,000</td> <td>150 m</td> <td>20,800</td> <td>△ 32 m</td> <td>△ 17.6 %</td> <td>2,800</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>計</td> <td>182 m</td> <td>18,000</td> <td>150 m</td> <td>20,800</td> <td>△ 32 m</td> <td>△ 17.6 %</td> <td>2,800</td> </tr> </tbody> </table> |       |        |        |          |        |          |       | 工 種 | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  | 事 業 量 |     | 事 業 費 | 事業量   | 事業費 | 変 更 後 | 事業費   | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 | 水路1号   | 182 m | 18,000 | 150 m | 20,800 | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 182 m | 18,000 | 150 m | 20,800 | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800 |
|  |  | 工 種  | 変 更 前 |        | 変 更 後  |          | 事 業 量  |          | 事 業 費 |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  | 事業量   | 事業費    | 変 更 後  | 事業費      | 増 減    | 増 減 率    | 増 減   |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  | 水路1号   | 182 m | 18,000 | 150 m  | 20,800   | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800 |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 計  | 182 m  | 18,000   | 150 m | 20,800 | △ 32 m | △ 17.6 % | 2,800  |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農道整備</td> <td>0 m</td> <td>0</td> <td>0 m</td> <td>0</td> <td>0 m</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  |  |  |       |        |        |          |        | 工 種      | 変 更 前 |     | 変 更 後 |  | 事 業 量 |  | 事 業 費 | 事業量 | 事業費   | 変 更 後 | 事業費 | 増 減   | 増 減 率 | 増 減 | 農道整備  | 0 m | 0      | 0 m   | 0      | 0 m   | %      | 0      |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 工 種  | 変 更 前  |  | 変 更 後 |        | 事 業 量  |          | 事 業 費  |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  | 事業量  | 事業費  | 変 更 後 | 事業費    | 増 減    | 増 減 率    | 増 減    |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 農道整備   | 0 m  | 0  | 0 m   | 0      | 0 m    | %        | 0      |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 農道整備   |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>計</td> <td>0 m</td> <td>0</td> <td>0 m</td> <td>0</td> <td>0 m</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |       |        |        |          |        | 工 種      | 変 更 前 |     | 変 更 後 |  | 事 業 量 |  | 事 業 費 | 事業量 | 事業費   | 変 更 後 | 事業費 | 増 減   | 増 減 率 | 増 減 |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 0 m | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 工 種  | 変 更 前  |  | 変 更 後 |        | 事 業 量  |          | 事 業 費  |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  | 事業量  | 事業費  | 変 更 後 | 事業費    | 増 減    | 増 減 率    | 増 減    |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
|  |  |  |       |        |        |          |        |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |
| 計  | 0 m  | 0  | 0 m   | 0      | 0 m    | %        | 0      |          |       |     |       |  |       |  |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |       |        |       |        |        |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |     |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |        |       |        |        |          |       |

(様式-5)

計 画 変 更 の 要 旨

山梨西部地区

| 該 当 事 項   | 変 更 を 要 す る 理 由  | 増 減 内 容  | 備 考     |           |           |           |           |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|---|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--------|---------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| <p>(5) 農用地の改良又は<br/>保全のため必要な工<br/>事<br/>イ<br/>受益面積の20%以上の変更</p> | <p>区画整理 該当無し</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画整理</td> <td>13.5 ha</td> <td>670,000</td> <td>12.5 ha</td> <td>1,038,600</td> <td>△ 1.0 ha</td> <td>△ 7.4 %</td> <td>368,600</td> </tr> </tbody> </table>   | 工 種     | 変 更 前     |           | 変 更 後     |           | 事 業 量    |         | 事 業 費 | 事業量 | 事業費   | 変 更 後 | 事業費 | 増 減   | 増 減 率 | 増 減      | 区画整理   | 13.5 ha | 670,000 | 12.5 ha | 1,038,600 | △ 1.0 ha  | △ 7.4 %  | 368,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  | 工 種  |         | 変 更 前     |           | 変 更 後     |           | 事 業 量    |         | 事 業 費 |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  |  | 事業量     | 事業費       | 変 更 後     | 事業費       | 増 減       | 増 減 率    | 増 減     |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  | 区画整理   | 13.5 ha | 670,000   | 12.5 ha   | 1,038,600 | △ 1.0 ha  | △ 7.4 %  | 368,600 |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  | <p>区画整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画整理 1</td> <td>13.5 ha</td> <td>670,000</td> <td>12.5 ha</td> <td>1,038,600</td> <td>△ 1.0 ha</td> <td>△ 7.4 %</td> <td>368,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13.5 ha</td> <td>670,000</td> <td>12.5 ha</td> <td>1,038,600</td> <td>△ 1.0 ha</td> <td>△ 7.4 %</td> <td>368,600</td> </tr> </tbody> </table> | 工 種     | 変 更 前     |           | 変 更 後     |           | 事 業 量    |         | 事 業 費 | 事業量 | 事業費   | 変 更 後 | 事業費 | 増 減   | 増 減 率 | 増 減      | 区画整理 1 | 13.5 ha | 670,000 | 12.5 ha | 1,038,600 | △ 1.0 ha  | △ 7.4 %  | 368,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        | 計      | 13.5 ha | 670,000 | 12.5 ha  | 1,038,600 | △ 1.0 ha | △ 7.4 % |
|   | 工 種  | 変 更 前  |         | 変 更 後     |           | 事 業 量     |           | 事 業 費    |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  | 事業量  | 事業費     | 変 更 後     | 事業費       | 増 減       | 増 減 率     | 増 減      |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   | 区画整理 1   | 13.5 ha  | 670,000 | 12.5 ha   | 1,038,600 | △ 1.0 ha  | △ 7.4 %   | 368,600  |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  |  |         |           |           |           |           |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  |  |         |           |           |           |           |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
| 計   | 13.5 ha  | 670,000  | 12.5 ha | 1,038,600 | △ 1.0 ha  | △ 7.4 %   | 368,600   |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
| <p>畑地かんがい施設<br/>既存施設の移設により対応可能となったため、<br/>新設面積が減となり、計画を廃止</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>畑地かんがい施設</td> <td>8.8 ha</td> <td>87,000</td> <td>0.0 ha</td> <td>0</td> <td>△ 8.8 ha</td> <td>△ 100.0 %</td> <td>△ 87,000</td> </tr> </tbody> </table>   | 工 種  | 変 更 前   |           | 変 更 後     |           | 事 業 量     |          | 事 業 費   | 事業量   | 事業費 | 変 更 後 | 事業費   | 増 減 | 増 減 率 | 増 減   | 畑地かんがい施設 | 8.8 ha | 87,000  | 0.0 ha  | 0       | △ 8.8 ha  | △ 100.0 % | △ 87,000 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   | 工 種  |  | 変 更 前   |           | 変 更 後     |           | 事 業 量     |          | 事 業 費   |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  | 事業量  | 事業費     | 変 更 後     | 事業費       | 増 減       | 増 減 率     | 増 減      |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   | 畑地かんがい施設   | 8.8 ha   | 87,000  | 0.0 ha    | 0         | △ 8.8 ha  | △ 100.0 % | △ 87,000 |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   | <p>区画整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">変 更 前</th> <th colspan="2">変 更 後</th> <th colspan="2">事 業 量</th> <th>事 業 費</th> </tr> <tr> <th>事業量</th> <th>事業費</th> <th>変 更 後</th> <th>事業費</th> <th>増 減</th> <th>増 減 率</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>畑地かんがい施設</td> <td>8.8 ha</td> <td>87,000</td> <td>0.0 ha</td> <td>0</td> <td>△ 8.8 ha</td> <td>△ 100.0 %</td> <td>△ 87,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8.8 ha</td> <td>87,000</td> <td>0.0 ha</td> <td>0</td> <td>△ 8.8 ha</td> <td>△ 100.0 %</td> <td>△ 87,000</td> </tr> </tbody> </table> | 工 種  | 変 更 前   |           | 変 更 後     |           | 事 業 量     |          | 事 業 費   | 事業量   | 事業費 | 変 更 後 | 事業費   | 増 減 | 増 減 率 | 増 減   | 畑地かんがい施設 | 8.8 ha | 87,000  | 0.0 ha  | 0       | △ 8.8 ha  | △ 100.0 % | △ 87,000 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 8.8 ha | 87,000 | 0.0 ha  | 0       | △ 8.8 ha | △ 100.0 % | △ 87,000 |         |
| 工 種   | 変 更 前  |  | 変 更 後   |           | 事 業 量     |           | 事 業 費     |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   | 事業量  | 事業費  | 変 更 後   | 事業費       | 増 減       | 増 減 率     | 増 減       |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
| 畑地かんがい施設  | 8.8 ha   | 87,000   | 0.0 ha  | 0         | △ 8.8 ha  | △ 100.0 % | △ 87,000  |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  |  |         |           |           |           |           |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
|   |  |  |         |           |           |           |           |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |
| 計   | 8.8 ha   | 87,000   | 0.0 ha  | 0         | △ 8.8 ha  | △ 100.0 % | △ 87,000  |          |         |       |     |       |       |     |       |       |          |        |         |         |         |           |           |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |        |         |         |          |           |          |         |



計 画 変 更 の 要 旨

| 第3条2項<br>3. 事業費の変動<br>農林水産省告示第2172号<br>三<br>農林水産大臣が定める主要工<br>事計画に関わる事業費の10%<br>以上の変動 | 総事業費<br>工法変更 352,600 千円<br>事業量変更 34,600 千円<br>自然増等<br>労務資材 18,800 千円<br>その他 千円<br>合計 406,000 千円 | 単位：千円   |   |     |               |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
|--|---|---|---|-----|---------------|---------------|----------|---------------|--|---------|---------------|------|-----|----|----------|---------|-----------|--------|--|--|---------|----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|------|---------|-----------|--------|--|--|---------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|----------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|--------|--|--|--|--|--------|-----|--------|--------|--|--|--|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|-----------|--------|--|--|---------|
|  |   | 「営農形態」及び「農作業機械効率」を考慮し、ほ場の耕作面積を確保し、複数の苗木の植付けを可能とする計画としたことから切盛土量が増となった。また、「整備後の法面の維持管理における安全性」を考慮し、土留構造物の見直しを行ったことによる増額。<br><br>ほ場整備区域における補償物の精査を実施したところ、当初影響がないと想定されていたブドウ棚、畑かん施設の移設が必要となったことから、補償費を増。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">A. 変更前<br/>事業費</th> <th rowspan="2">B. 変更後<br/>事業費</th> <th colspan="3">C. 自然増等</th> <th rowspan="2">D. 工法変更</th> <th rowspan="2">E. 事業量<br/>変 更</th> </tr> <tr> <th>労務資材</th> <th>その他</th> <th>用地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業生産基盤整備</td> <td>775,000</td> <td>1,059,400</td> <td>18,800</td> <td></td> <td></td> <td>352,600</td> <td>△ 87,000</td> </tr> <tr> <td>農業用排水路</td> <td>18,000</td> <td>20,800</td> <td>2,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画整理</td> <td>670,000</td> <td>1,038,600</td> <td>16,000</td> <td></td> <td></td> <td>352,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>畑かん施設</td> <td>87,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>△ 87,000</td> </tr> <tr> <td>測量試験費</td> <td>45,000</td> <td>74,210</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,210</td> </tr> <tr> <td>文化財調査費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地買収補償費</td> <td>5,000</td> <td>87,390</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82,390</td> </tr> <tr> <td>換地費</td> <td>22,000</td> <td>32,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>工事雑費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>847,000</td> <td>1,253,000</td> <td>18,800</td> <td></td> <td></td> <td>352,600</td> <td>34,600</td> </tr> </tbody> </table> | 工 種 | A. 変更前<br>事業費 | B. 変更後<br>事業費 | C. 自然増等  |               |  | D. 工法変更 | E. 事業量<br>変 更 | 労務資材 | その他 | 用地 | 農業生産基盤整備 | 775,000 | 1,059,400 | 18,800 |  |  | 352,600 | △ 87,000 | 農業用排水路 | 18,000 | 20,800 | 2,800 |  |  |  |  | 区画整理 | 670,000 | 1,038,600 | 16,000 |  |  | 352,600 |  | 畑かん施設 | 87,000 |  |  |  |  |  | △ 87,000 | 測量試験費 | 45,000 | 74,210 |  |  |  |  | 29,210 | 文化財調査費 |  |  |  |  |  |  |  | 用地買収補償費 | 5,000 | 87,390 |  |  |  |  | 82,390 | 換地費 | 22,000 | 32,000 |  |  |  |  | 10,000 | 工事雑費 |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 | 847,000 | 1,253,000 | 18,800 |  |  | 352,600 |
| 工 種  | A. 変更前<br>事業費   | B. 変更後<br>事業費   | C. 自然増等   |     |               |               | D. 工法変更  | E. 事業量<br>変 更 |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
|  |   |   | 労務資材  | その他 | 用地            |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 農業生産基盤整備   | 775,000   | 1,059,400   | 18,800  |     |               | 352,600       | △ 87,000 |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 農業用排水路   | 18,000  | 20,800  | 2,800   |     |               |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 区画整理   | 670,000   | 1,038,600   | 16,000  |     |               | 352,600       |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 畑かん施設  | 87,000  |   |   |     |               |               | △ 87,000 |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 測量試験費  | 45,000  | 74,210  |   |     |               |               | 29,210   |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 文化財調査費   |   |   |   |     |               |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 用地買収補償費  | 5,000   | 87,390  |   |     |               |               | 82,390   |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 換地費  | 22,000  | 32,000  |   |     |               |               | 10,000   |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 工事雑費   |   |   |   |     |               |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
| 合 計  | 847,000   | 1,253,000   | 18,800  |     |               | 352,600       | 34,600   |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |
|  |   | $\frac{D+E}{A} = \frac{387,200}{847,000} \times 100$ $= 45.7 \% > 10\%$   |   |     |               |               |          |               |  |         |               |      |     |    |          |         |           |        |  |  |         |          |        |        |        |       |  |  |  |  |      |         |           |        |  |  |         |  |       |        |  |  |  |  |  |          |       |        |        |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |       |        |  |  |  |  |        |     |        |        |  |  |  |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |     |         |           |        |  |  |         |

農業用排水路

変更前

変更後

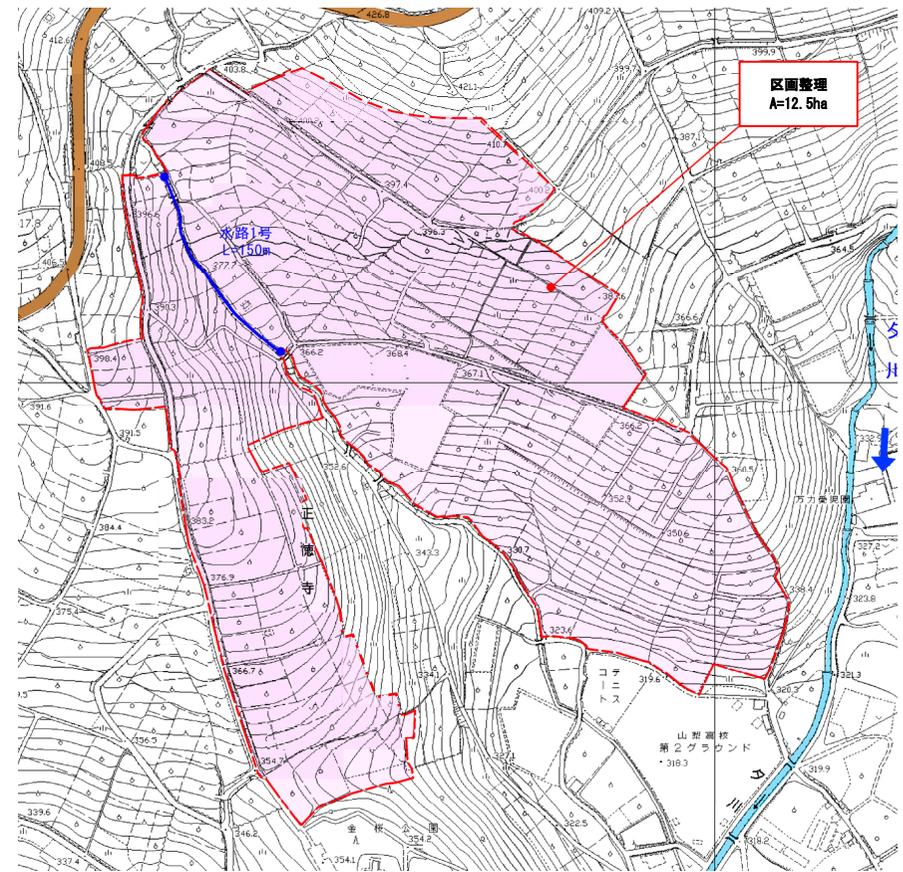
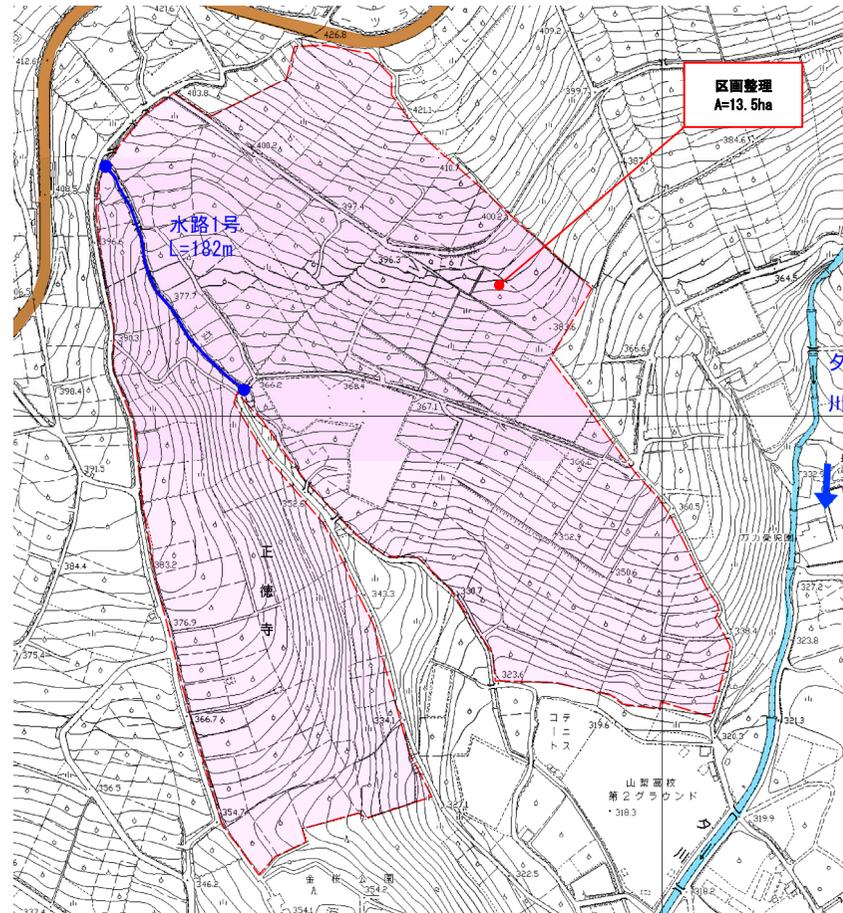


現地測量及び現地精査の結果をふまえ、一部範囲において既設利用可能であることから事業量の減。

区画整理

変更前


変更後

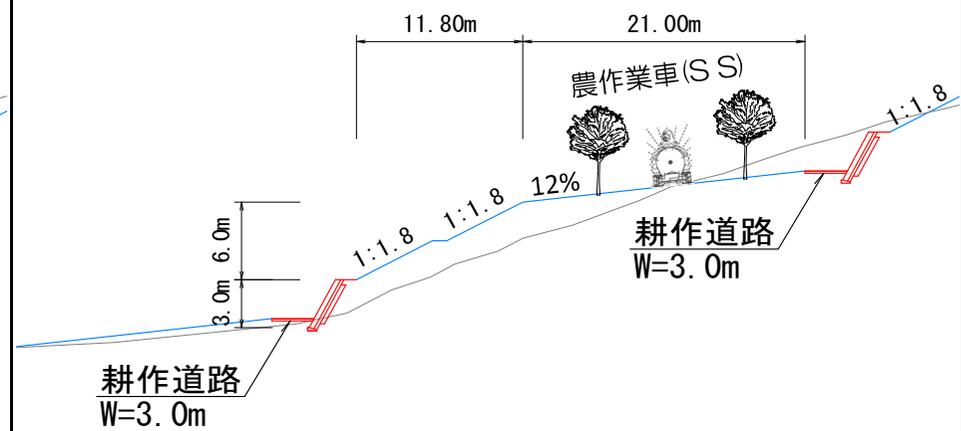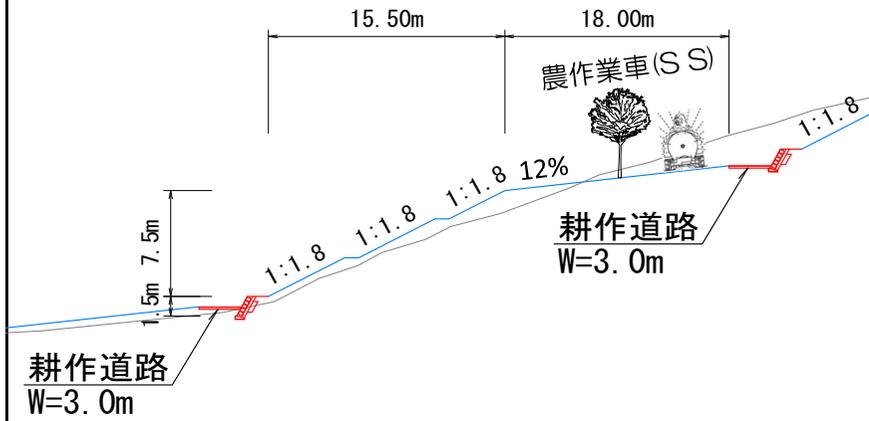


- ・「営農形態」及び「農作業機械効率」を考慮し、ほ場の耕作面積を確保し、複数の苗木の植付けを可能とする計画としたことから切盛土量が増となった。また、「整備後の法面の維持管理における安全性」を考慮し、土留構造物の見直しを行ったことによる増額。
- ・現地精査の結果、当初区画整備範囲であった急峻な地形の範囲については、整備を断念したことにより事業量の減。

畑地かんがい施設

変更前

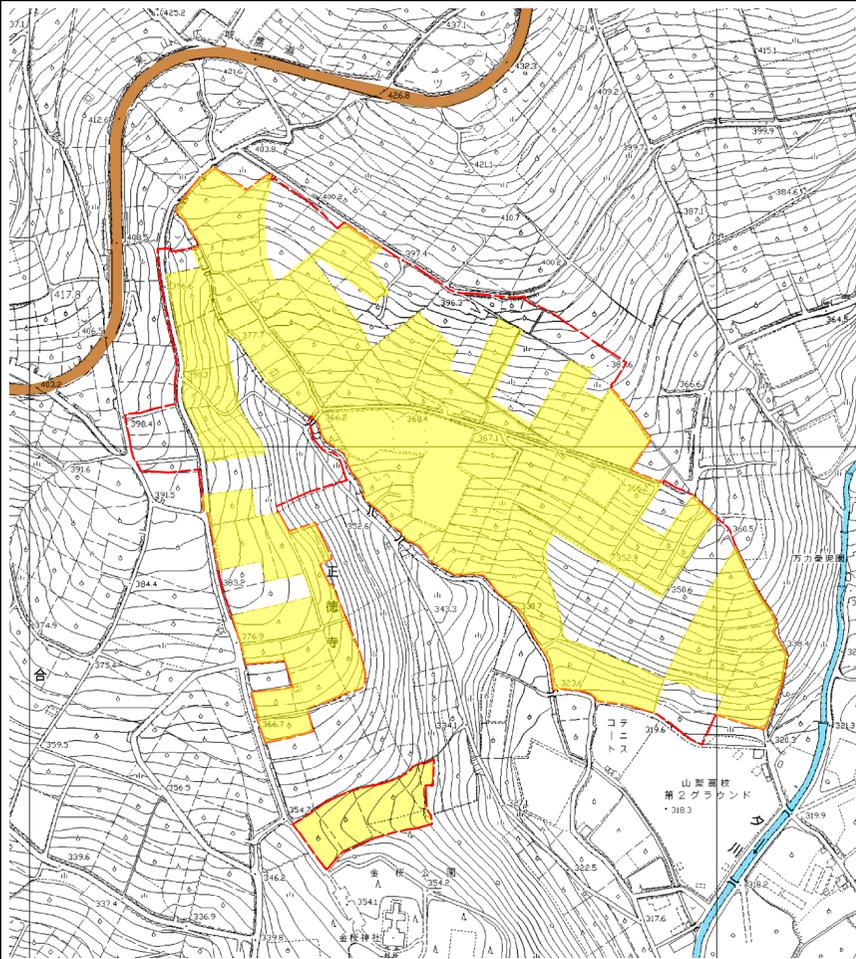

変更後

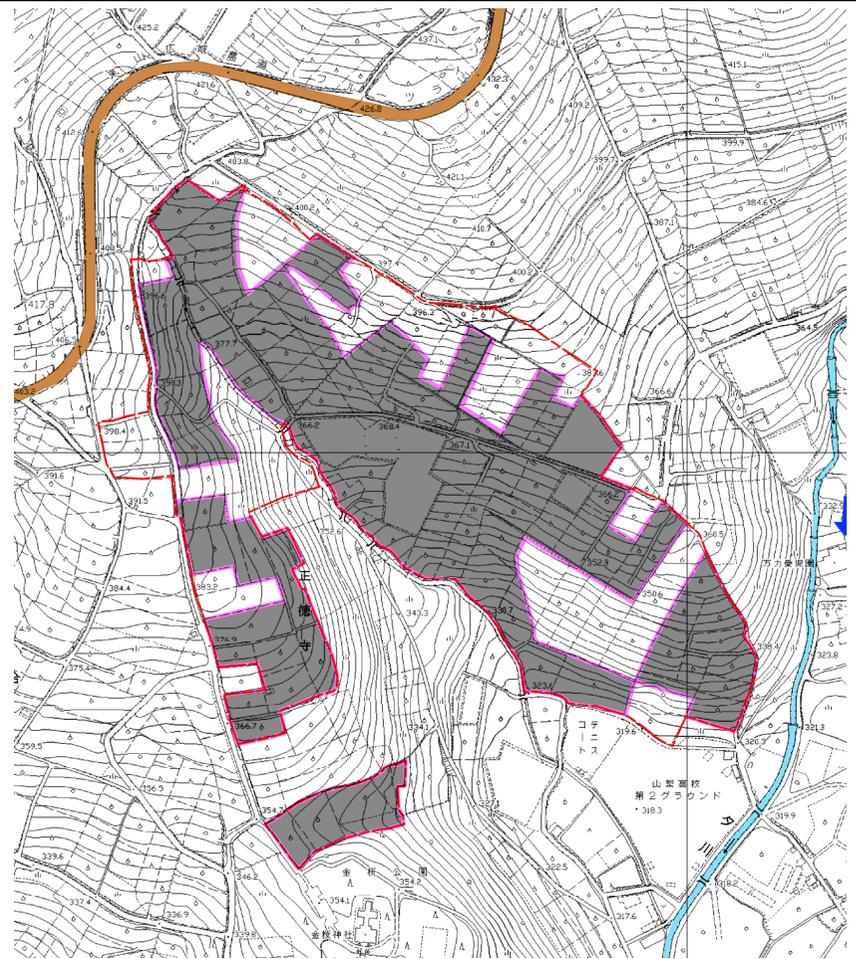

既存施設の移設により対応可能となったため、新設面積が減となり、計画を廃止
