

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期） 道路改良工事（一部債務）

皆様方には日頃から公共工事にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本工事の作業は、ほぼ完了し最終的な局面を向かえております。長期間にわたる工事でありましたが、皆様方のご協力を賜り無事完成を向かえることができそうです。

今後も環状線工事は続きます。皆様方にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和元年9月
初旬撮影



至石和

令和2年9月
初旬撮影



至南アルプス

施工会社：



大新工業株式会社

山梨県甲府市太田町7番1号

055-233-5518

現場代理人 源川雅之



ありがとうございました。
いました。


国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事(一部債務)

小曲18工区

日頃より、地域住民の皆様におかれましては、工事へのご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。

現在、鋼桁の架設作業は終盤を迎えており、引き続き足場工、高力ボルト工合成床版架設工等となります。

工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。

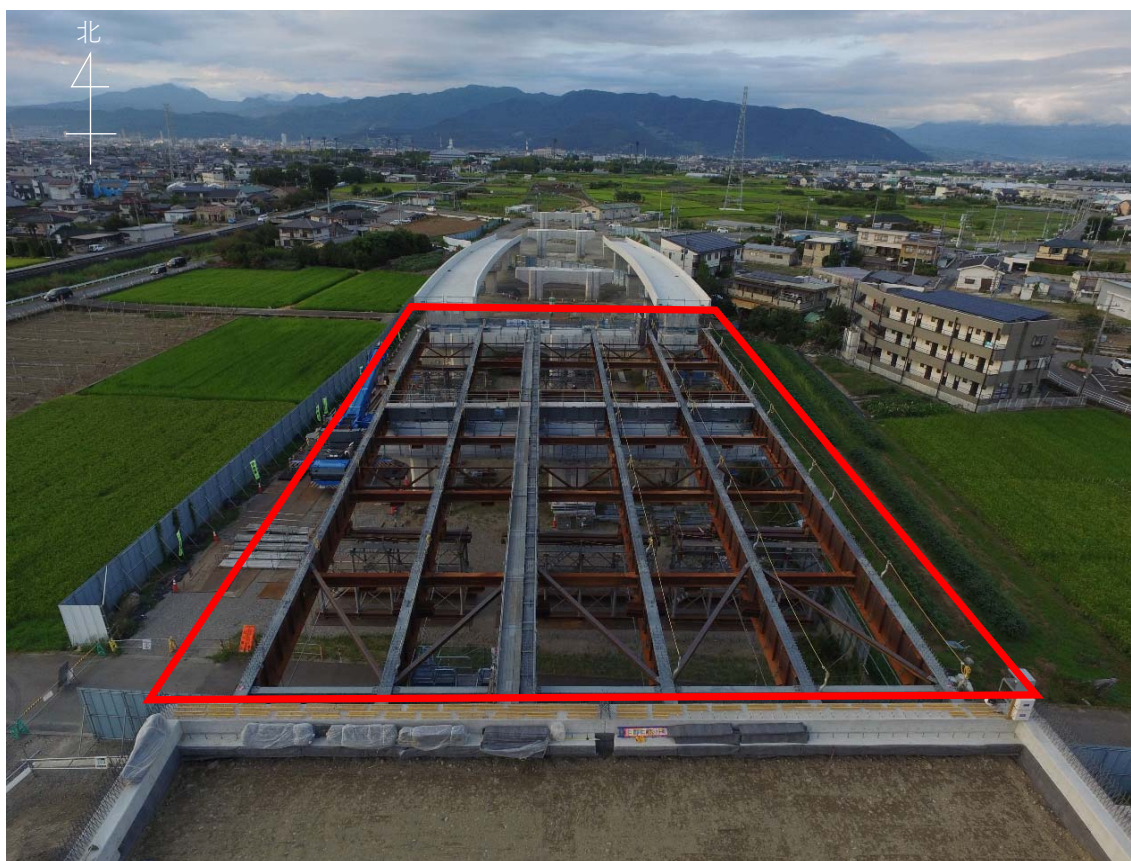

工 期：令和元年8月28日～令和2年12月15日

工 事 概 要：鋼橋製作・架設工

鋼2径間連続非合成钣桁橋 橋長L=59.0m 幅員W=29.36～34.42m

工場製作工 296.7t

架設工 1式

工事進捗状況：85.9% (令和2年8月末時点)

現場代理人・監理技術者

飯田鉄工(株) 志村 一也

山梨県笛吹市境川町石橋1314番地

監理技術者

(株)榑崎製作所 佐藤 有悟

北海道室蘭市崎守町385番地



飯田鉄工・榑崎製作所共同企業体

令和元年度

国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

落合西オンランプ橋(仮称) 橋梁上部工建設工事(一部債務)

日頃より、地域住民の皆様には、
工事へのご理解とご協力を頂きありがとうございます。
す。

当現場は、地域住民の方々の協力により、8月
17日無事に工事を終えることができました。



令和2年8月撮影

工 期 : 令和元年8月9日～令和2年8月26日

工 事 概 要 : 橋梁上部工

RC4径間連続中空床版橋 L=99.0m W=5.5m(6.41m)

コンクリート V=370m³ PC鋼材 L=1381m

支承工 N=10個 落橋防止装置工 N=2箇所

橋梁付属物工 一式

工事進捗状況 : 8月17日完成




真心と確かな技術

株式会社 早野組

株式会社 早野組

現場代理人 井上博路

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）落合西オフランプ橋（仮称）
橋梁上部工建設工事（一部債務）



日頃より、地域住民の皆様には、工事のご理解ご協力を
頂きありがとうございました。

この度、令和2年8月18日を持ちまして、工事完成となりま
した。

今後も、新環状道路の建設事業は継続していきますが、
引き続き皆様のご理解・ご協力を切にお願い致します。



オフランプ橋施工箇所

工 期：令和元年8月9日～令和2年8月26日

工 事 概 要：橋梁上部工

RC4径間連続中空床版橋 L=99.0m W=5.5m (6.41m)

コンクリート V=370m³ PC鋼材 L=1381m


支承工 N=10個 落橋防止装置工 N=2箇所

橋梁附属物工 一式

工事進捗状況：8月末時点 100.0%

株式会社 三枝組

現場代理人 相原 伸年



国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

道路改良工事（一部債務）


（小曲町22工区）

日頃より、地域の皆様におかれましては工事へのご理解とご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。

現在、小曲22工区では、盛土工が完了し、残すは、排水工と舗装工の路盤工事となりました。

工事も終盤となっておりますが、安全第一で1日も早い工事の完成を目指してまいりますので、今後ともご協力の程をよろしくお願いいたします。

工 期 令和元年9月10日～令和2年11月13日
工事概要 道路改良工事 L=251m
盛土工 V=55,500m³ 地盤改良工(中層混合処理工) V=2,302m³
補強土壁工 H=2.4～4.2m A=130m³ カルバート工 N=2基
排水工 L=680m 舗装工 A=5,290m²
工事進捗率 85.1%(8月末日)

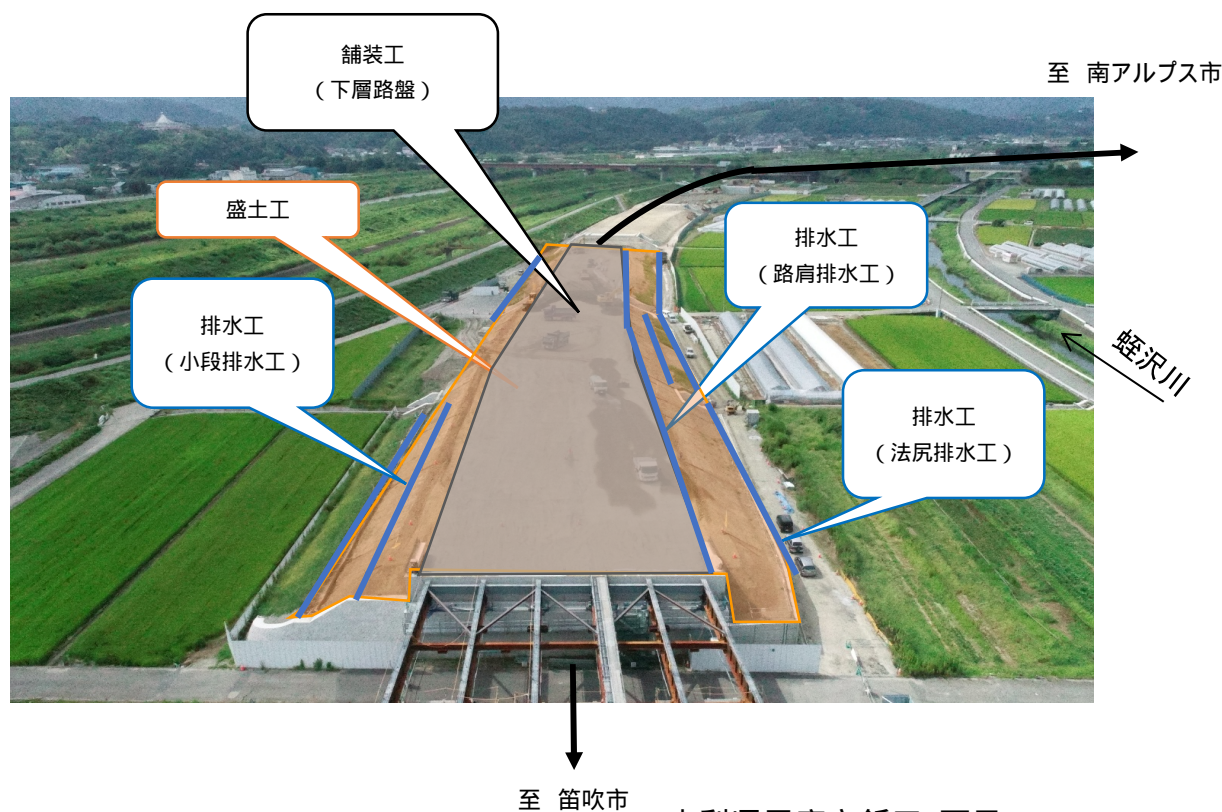

長田組土木株式会社

山梨県甲府市飯田4丁目10-27
TEL:055-231-1111(代表)
TEL:055-231-1093(土木部直通)
現場代理人:相馬 英人
